



**T.C.
ÇANKIRI KARATEKİN
ÜNİVERSİTESİ**

**YATIRIM İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME RAPORU**

2015

İçindekiler

1. YÖNETİCİ ÖZETİ	- 1 -
2. GENEL DEĞERLENDİRME	- 2 -
2.1. Üniversitemizin Vizyonu	- 2 -
2.2. Üniversitemizin Misyonu	- 2 -
2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri	- 2 -
2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları	- 3 -
2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu	- 3 -
2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi.....	- 5 -
2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı	- 5 -
2.8. Yatırımlarla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	- 6 -
2.9. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	- 7 -
3. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI	- 8 -
3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	- 8 -
3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	- 14 -
3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.....	- 16 -
3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.....	- 18 -
4. ÖNERİLER	- 20 -
5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU	-22-

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Yükseköğretim camiasının dinamik bir kurumu olarak 2007 yılında kurulan, 2008 yıl sonundan itibaren yapılanma çalışmalarına başlayan Üniversitemiz fiziki mekan yetersizliğinin oluşturduğu kısıtlı imkanlar ve yetersiz kaynaklara rağmen elde ettiği kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak Uluyazı yerleşke inşaatı çalışmalarının birinci etabını tamamlama aşamasına gelmiştir. Üniversitemiz, modern eğitim-öğretim alanlarında nitelikli eğitim sunmayı kendisine ilke edinmiş bir kurum olarak güncel teknolojik imkanları öğrenci ve akademisyenlerinin kullanımına sunmaya gayret etmektedir. Bu gayretler neticesinde 2010 yılında başlanılan yerleşke inşaat çalışmalarında inşası tamamlanan eğitim-öğretim ve hizmet birimlerini modern ve teknolojik ekipmanlarla donatılarak kullanıma açmıştır. Böylece 2014-2015 eğitim-öğretim yılını yeni yerleşkesinde karşılamının haklı gururunu Çankırı Karatekin Üniversitesi ailesi olarak hep birlikte yaşadık. Her geçen gün yerleşkemizi daha da güzelleştirmeye çalışmaktayız.

Uluyazı yerleşke inşaatı çalışmaları kapsamında daha önce tamamlanan 2 Blok Fen Fakültesi ve Kafeterya Binası, Rektörlük Hizmet Binası, 2 Blok Merkezi Derslik, Edebiyat Fakültesi ve Kafeterya Binası, Yemekhane Binası, Merkezi Laboratuvar Binası, Kapalı Spor Salonu ve İ.İ.B.F. Binasına ilave olarak 2015 yılı içerisinde Merkezi Kütüphane Binası tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bunların yanında K.Y.K. tarafından 1.000 öğrenci kapasiteli yurt binasına ilave olarak yaklaşık 1.900 öğrenci kapasiteli iki adet yurt binası hizmete açılmıştır. Aynı zamanda alt yapı yatırımlarımıza da devam edilmiştir. Yatırım planlamamızda yapılan yatırımların etkili ve verimli bir şekilde hizmete alınması, zamanında ve yerinde yapılması, en az yatırımla en çok faydanın sağlanması azami özen gösterilen hususları teşkil etmektedir. Bütün gayretlerimize rağmen planlanan yatırımları zamanında gerçekleştirilebilmek için tahsis edilen kamu kaynaklarının zamanında kullanılabilir ve ulaşılabilir duruma getirilmesi yatırım politikamızı etkileyen en önemli hususu oluşturmaktadır. Tahsis edilen kamu kaynaklarının zamanında ulaşılabilir olmaması halinde belirlenmiş amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet ve hizmetlerde aksama yaşanmaktadır. Bu aksamalar en az maliyetle en fazla faydanın elde edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda da verimsizlik oluşturmaktadır.

Kuruluşundan itibaren uyguladığı yatırım politikalarıyla en etkili yatırım süreçlerini oluşturmaya gayret eden Üniversitemizin “2015 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu” nu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci ve 60’ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hazırlamış bulunmaktayız.

Gerçekleştirilen yatırımların kamuoyunun denetimine sunulması ve hesap verilebilirliği sağlayabilmek amacıyla söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunar, raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarımızla ilgili olarak özveri ile faaliyetleri yürüten bütün paydaşlarımıza ve personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Üniversitemizin Vizyonu

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen bir kurum olmaktadır.

2.2. Üniversitemizin Misyonu

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen ve toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet edebilen, eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2012-2016 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.

Amaç 1: Eğitim ve Öğretimin Nitelik ve Etkinliğini Artırmak

Hedef 1: Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek

Hedef 2: Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek

Amaç 2: Akademik Yapıyı Geliştirmek

Hedef 1: Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayın ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak

Hedef 2: Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak

Amaç 3: Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

Hedef 1: Şeffaf, Adaletili, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek

Hedef 2: Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak

Hedef 3: Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak

Hedef 4: Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak

Hedef 5: Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak

Amaç 4: Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi

Hedef 1: Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak

Hedef 2: Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak

Hedef 3: Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak

Hedef 4: Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek

Hedef 5: Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, Kaynaklarının Değerlendirilmesine, Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak

Hedef 6: Sağlık Hizmetleri, Tarım Gibi Alanlarda Bölge İhtiyaçlarına Yönelik Çalışmalar Yapmak

Amaç 5: Finansman Kaynaklarını Geliştirmek

Hedef 1: Gelir Sağlayıcı Faaliyetler İçerisine Girmek

Hedef 2: Mevcut Gelirleri Artırmak

2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz ağırlıklı olarak öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2015 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir tahminleri;

a) Hazine yardımları	: ₺72.203.000,00
b) Öz gelirler	: ₺4.422.000,00

olmak üzere toplamda **₺76.625.000,00'** dir.

Üniversitemizin 2015 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan eklemelerle bu ödenek ₺93.835.802,00 olmuş, söz konusu ödeneğin ₺26.220.623,83'si yatırım giderlerinin finansmanında kullanılmıştır. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır.

2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

GELİRİN EKONOMİK KODU	PLANLANAN GELİR (₺)	GERÇEKLEŞEN GELİR (₺)
03.1.1.01	25.000,00	11.993,00
03.1.1.99	0,00	386,82
03.1.2.03	4.000,00	0,00
03.1.2.29	254.000,00	132.035,33
03.1.2.31	1.975.000,00	2.731.998,85
03.1.2.32	0,00	203.581,81
03.1.2.33	9.000,00	258,00
03.1.2.34	24.000,00	25.819,00
03.1.2.35	4.000,00	0,00
03.1.2.36	0,00	94.734,01
03.1.2.38	423.000,00	323.550,00
03.1.2.41	0,00	939,00
03.1.2.99	506.000,00	925.061,49
03.6.1.01	32.000,00	58.668,38
03.6.1.03	110.000,00	112.515,39
03.6.1.99	0,00	79.933,32
04.2.1.01	50.203.000,00	58.801.750,00
04.2.2.01	22.000.000,00	26.208.500,00
04.4.1.04	0,00	8,70
04.4.2.03	0,00	2.478,89
04.5.1.10	0,00	120.887,45
05.1.9.01	0,00	78,03
05.1.9.99	0,00	3.587,15
05.2.6.16	45.000,00	70.793,68
05.3.2.99	2.000,00	277.880,10
05.3.9.99	0,00	1.760,20
05.9.1.01	0,00	296.370,64
05.9.1.03	0,00	650.600,00
05.9.1.06	8.000,00	86.190,08
05.9.1.19	1.000.000,00	1.398.636,00
05.9.1.99	1.000,00	85.167,53
Toplam	76.625.000,00	92.706.162,85

(*) Ayrıca ₺5.756.378,84 tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları kullanılarak ödenekleştirilmiştir.

2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Uluyazı Yerleşke Alanı	118.300	2.280.791	-	2.399.091	Tahsisli
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	855	-	855	Tahsisli
Orman Fakültesi	-	-	5.260	5.260	Tahsisli
Balıca Yerleşkesi	-	41.809	-	64.090	Tahsisli
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	23.552	-	23.552	Tahsisli
Sağlık Yüksekokulu	-	22.878	-	22.878	Tahsisli
Güzel Sanatlar Fakültesi	-	-	4.204	4.204	Kira
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	385.074	-	385.074	Tahsisli

2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3. Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı

Bina Adı	Taşınmaz Alanı (m ²)
Derslik Binası	74.500
İdari Bina	9.283
Kütüphane	9.400
Laboratuvar Binası	3.166
Lojman	4.850
Sosyal Tesis	1.024
Spor Salonu	12.965
Yemekhane	7.677
Yurt binası (1 Adet)	4.500

2.8. Yatırımlarla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Mevcut birimlerimizin teknik altyapı ve donanımlarının rehabilitasyon çalışmaları ile Uluyazı Yerleşke alanımızda hizmet binası inşaat çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 2015 yılsonu itibariyle yapımı tamamlanan ve devam eden hizmet binalarımıza ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.



Şekil 1. Üniversitemiz Uluyazı kampüs alanından bir kesit.

Uluyazı Yerleşke alanında 2009 yılı ekim ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hibe olarak yapımına başlanan Rektörlük idari hizmet binası inşaatı ile Uluyazı Yerleşke inşaat çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında;

- ✚ Fen Fakültesi Hizmet Binaları ve kafeteryası,
- ✚ Edebiyat Fakültesi Hizmet Binası ve kafeteryası,
- ✚ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hizmet Binası,
- ✚ 2 Blok Merkezi Derslikler,
- ✚ Merkezi Laboratuvar Binası,
- ✚ Kapalı Spor Salonu,
- ✚ Yemekhane Binası inşaatları tamamlanarak hizmete alınmıştır.

Uluyazı Yerleşkesi içerisinde 9.500 m² kapalı alana sahip Merkezi Kütüphane inşaatı tamamlanma aşamasına getirilmiş olup 2016 yılı başında hizmete alınması planlanmaktadır.

Uluyazı Yerleşkesi içerisinde yapılması planlanan açık spor tesislerinin ihalesi tamamlanmış ancak fiziki gerçekleştirme sağlanamamıştır. Yine Kredi ve Yurtlar Kurumu

Genel Müdürlüğünce yaptırılan öğrenci yurdu da kampüs alanı içerisinde hizmete açılmış, il genelinde yaklaşık 1.900 öğrenci kapasiteli iki adet yurt binası daha hizmete alınmıştır.

Bunların yanında 2015 yılı büyük onarım işleri kapsamında mevcut hizmet binalarında iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Uluyazı Yerleşkesi içerisinde altyapı işlemleri kapsamında;

- ✚ 730.000 m³ kazı imalatı yaptırılmıştır.
- ✚ 357.000 m³ dolgu imalatı yaptırılmıştır.
- ✚ 37.500 m² bitkisel toprak tabakası teşkil edilmiştir.
- ✚ 16.800 m² araç yolu ve otopark BSK asfalt kaplama yaptırılmıştır.
- ✚ 16.000 m² yaya yolu altyapısı ve andezit kaplaması yaptırılmıştır.
- ✚ 5.850 m³ taş duvar imalatı yaptırılmıştır.


2.9. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.9.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarı olarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Sektör	2015 Yılı KBÖ (₺)	2015 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi (₺)	Oran (%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	21.000.000,00	26.220.623,83	125
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1.000.000,00	0	
Toplam	22.000.000,00	26.220.623,83	119

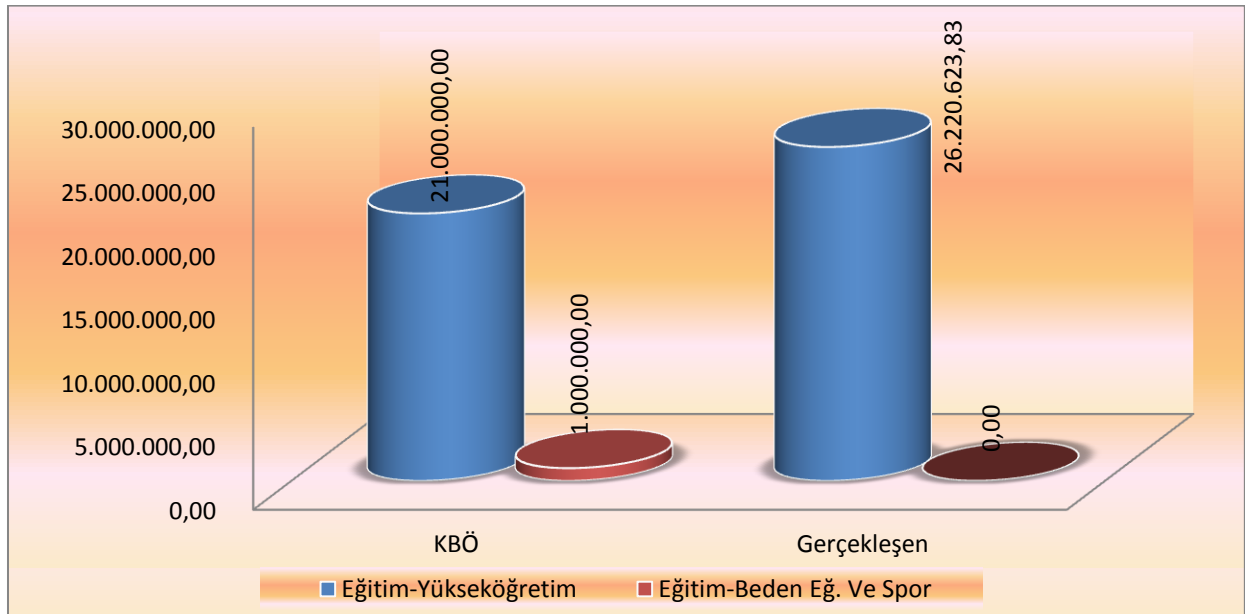

Şekil 2. 2015 Yılı Genel Yatırım Uygulama Grafiği

2.9.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

EKO. KOD	AÇIKLAMA	2015 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (₺)	2015 YILI EKLENEN ÖDENEK (₺)	2015 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK (₺)	2015 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (₺)	HARCAMA (₺)
06.1	Mamul Mal Alımları	8.297.000,00	637.300,00	0,00	8.934.300,00	7.553.302,65
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	155.000,00	30.000,00		185.000,00	184.324,60
06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	13.000.000,00	9.459.078,84	0,00	22.459.078,84	17.611.480,30
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	546.000,00	330.000,00	0,00	876.000,00	871.516,28
	TOPLAM	22.000.000,00	10.456.378,84		32.456.378,84	26.220.623,83

3. 2015 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi						
Proje No: 2015H030950						
Yılı	Proje Ödeneği (₺)	Revize Ödenek (₺)		Toplam (₺)	Harcama (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2015	100.000,00	0	0	100.000,00	53.041,00	53

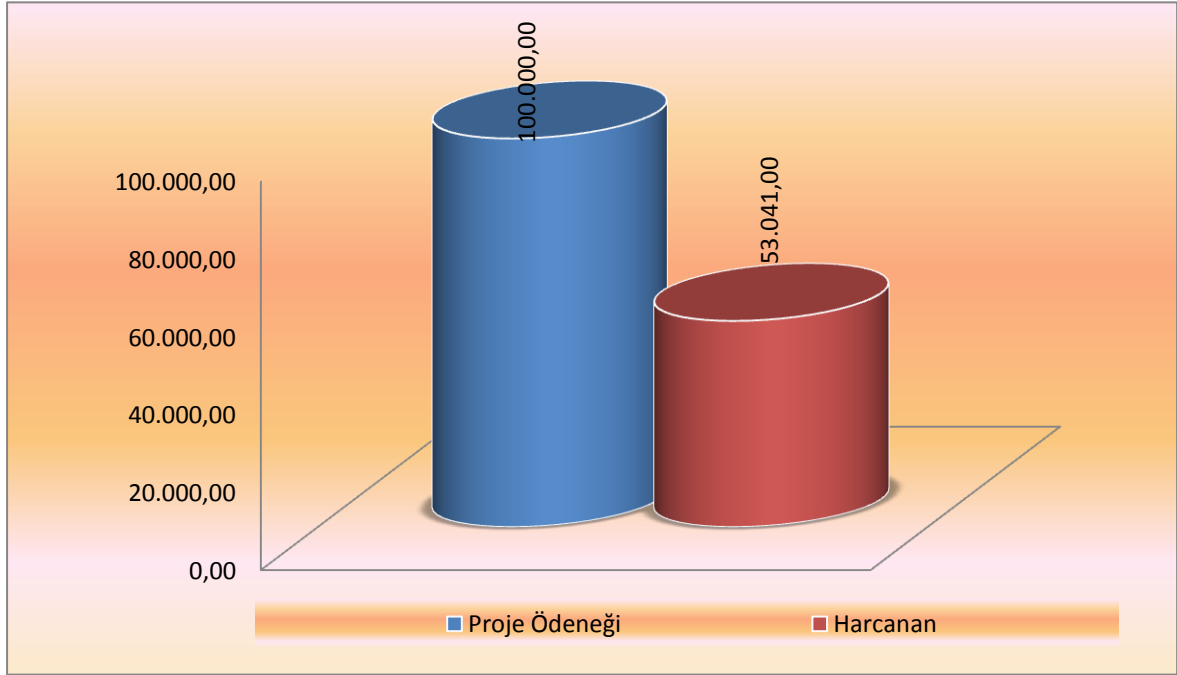


Şekil 3. Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi (Proje No: 2015H030950) Gerçekleşme Grafiği

2015 yılında Uluyazı kampüs alanı etüt-proje işlerinin gerçekleştirilebilmesi ve 2015H030950 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi kapsamında projelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için Üniversitemize ayrılan proje ödeneği toplam ₺100.000,00'dir. Başlangıç ödeneğinin ₺53.041,00'si Çeşitli Ünitelerin Etüt-Proje giderlerinde kullanılarak %53 gerçekleştirme sağlanmıştır.

- "Kampüs Heyelan Alanı için Fore Kazıklı Uyg.Pro.Yapım İşine" ait uygulama projesi yaptırılmıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)						
Proje No: 2015H030960						
Yılı	Proje Ödeneği (₺)	Revize Ödenek (₺)		Toplam (₺)	Harcama (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2015	546.000,00	330.000,00	0	876.000,00	871.516,28	99

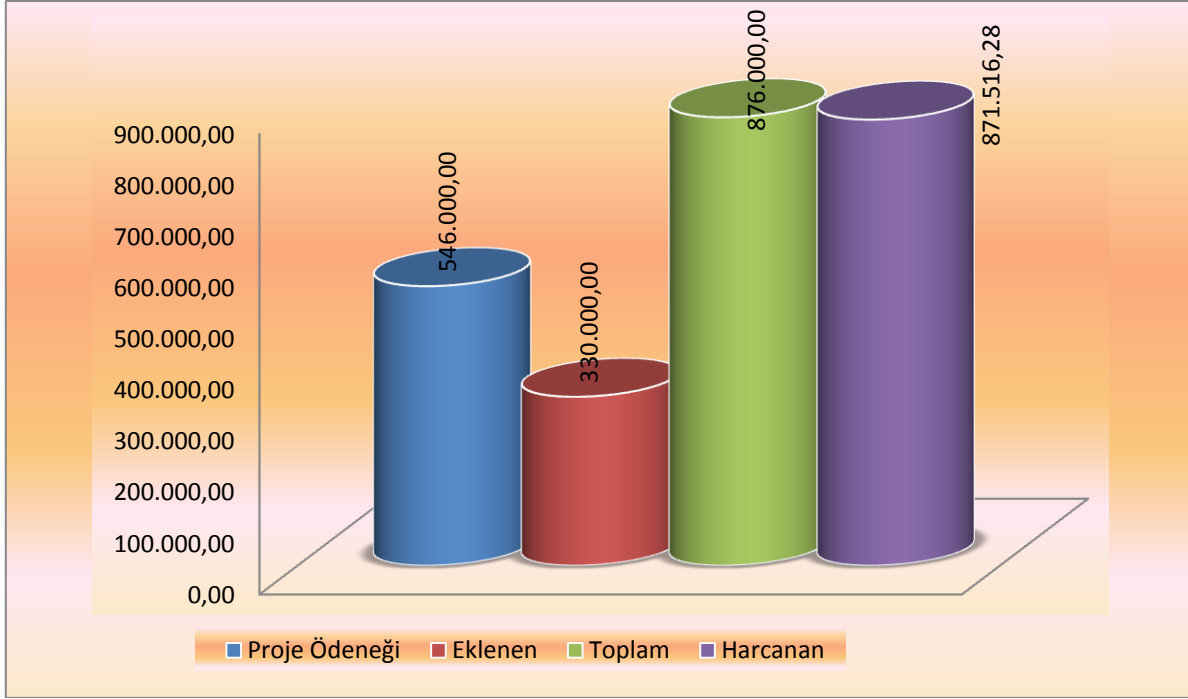


Şekil 4. Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesi (Proje No: 2015H030960) Gerçekleşme Grafiği

2015 yılında 2015H030960 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam ₺546.000,00 tutarındaki ödeneye yıl içinde ₺330.000,00 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek ₺876.000,00 olmuştur. Söz konusu ödenenin ₺871.516,28'si kullanılarak %99 gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında Şehir Kampüslerinde:

- ✚ Rektörlük binasının ışıklığı yenilenmiş ve çatı ısı izolasyonu yaptırılmıştır.
- ✚ Taşmescit Meslek Yüksekokulu A-D-G bloklarında bulunan ıslak hacimler yenilenmiştir.
- ✚ Uluyazı Kampüsü giriş kapısı alüminyum kompozit malzeme ile kaplanmış, üzeri led ile ışıklandırılmıştır.
- ✚ Taşmescit Meslek Yüksekokuluna 3 adet uygulama atölyesi yaptırılmıştır.
- ✚ Edebiyat Fakültesinde 4 oda alçıpan duvarlarla bölünerek yeniden boyanmıştır.
- ✚ Yapraklı Meslek Yüksekokulu spor salonuna fitness bölümü yaptırılmıştır.
- ✚ Ek binada bulunan odalar kullanım ihtiyacına göre bölünerek, boyanmıştır.

Proje Adı: Kampüs Altyapısı						
Proje No: 2009H030810						
Yılı	Proje Ödeneği (₺)	Revize Ödenek (₺)		Toplam (₺)	Harcama (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2015	5.400.000,00	3.001.480,00	0	8.401.480,00	8.399.900,83	100

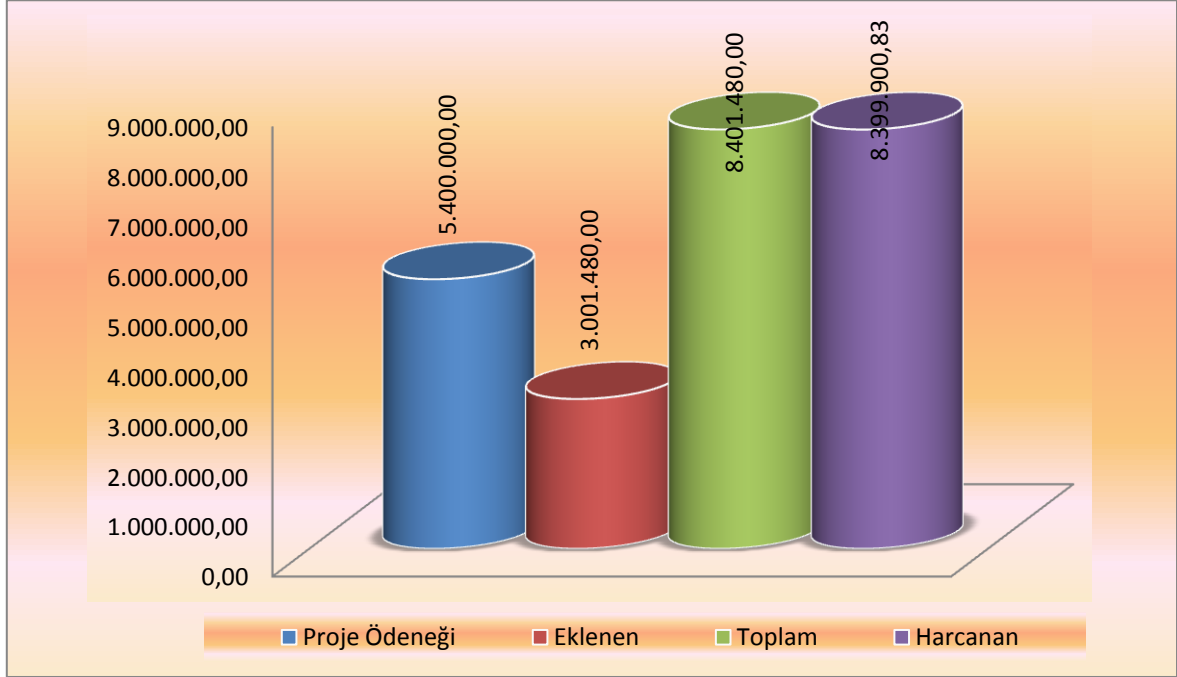


Şekil 5. Kampüs Altyapısı Projesi (Proje No:2009H030810) Gerçekleşme Grafiği

2015 yılında Uluyazı kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2009H030810 nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam ₺5.400.000,00 tutarındaki ödeneye yıl içinde ₺3.001.480,00 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek ₺8.401.480,00 olmuştur. Söz konusu ödenenin ₺8.399.900,83'si altyapı tesis giderlerinde kullanılarak yaklaşık %100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında Merkez Kampüsünde:

- ✚ 730.000 m³ kazı imalatı yaptırılmıştır.
- ✚ 357.000 m³ dolgu imalatı yaptırılmıştır.
- ✚ 37.500 m² bitkisel toprak tabakası teşkil edilmiştir
- ✚ 16.800 m² araç yolu ve oto park BSK asfalt kaplama yaptırılmıştır.
- ✚ 16.000 m² yaya yolu altyapısı ve andezit kaplaması yaptırılmıştır.
- ✚ 5.850 m³ taş duvar imalatı yaptırılmıştır.

Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler						
Proje No: 2009H030820						
Yılı	Proje Ödeneği (₺)	Revize Ödenek (₺)		Toplam (₺)	Harcama (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2015	6.500.000,00	5.588.940,00	0	12.088.940,00	9.158.538,47	76

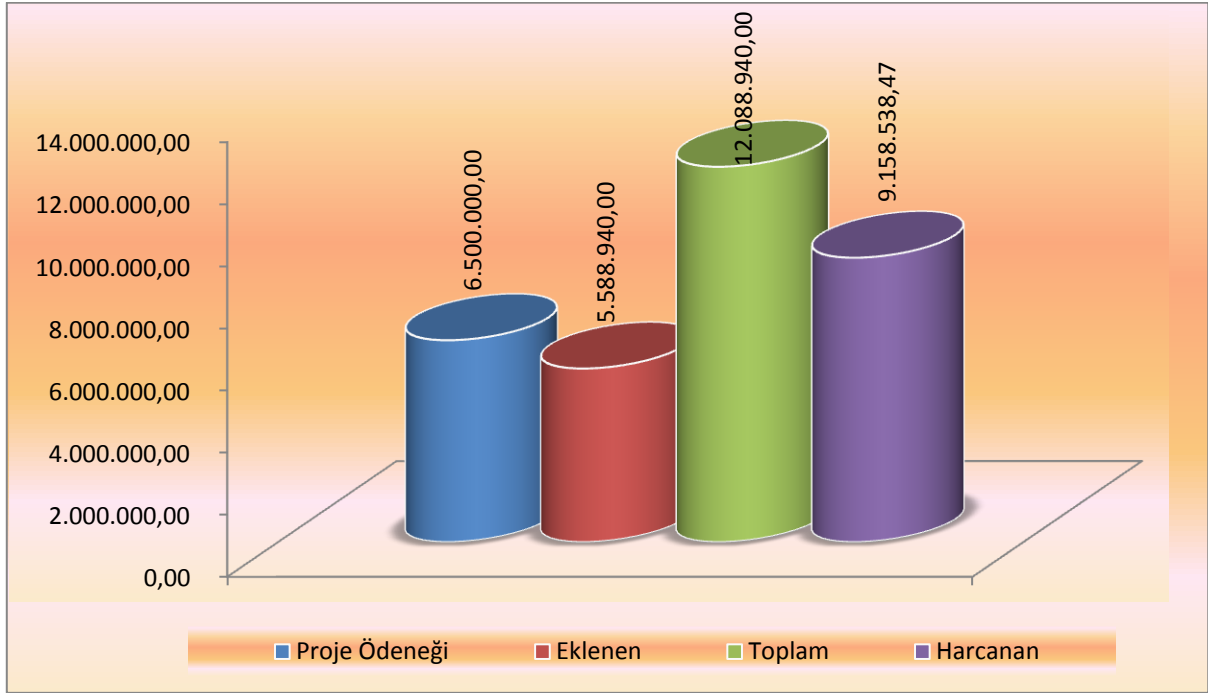


Şekil 6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Proje No:2009H030820) Gerçekleşme Grafiği

2015 yılında 2009H030820 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam ₺6.500.000,00 tutarındaki ödeneye yıl içinde ₺5.588.940,00 ödenek eklenmiş ve toplam ₺12.088.940,00 ödeneğin ₺9.158.538,47'si Derslik ve Merkezi Birimler Projesi giderlerinde kullanılarak %76 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında Merkez Kampüsünde:

- ✚ 9.400 m² Merkezi Kütüphane Binası tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
Proje No: 2010H050110						
Yılı	Proje Ödeneği (₺)	Revize Ödenek (₺)		Toplam (₺)	Harcama (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2015	1.000.000,00	868.658,84	0	1.868.658,84	0	-

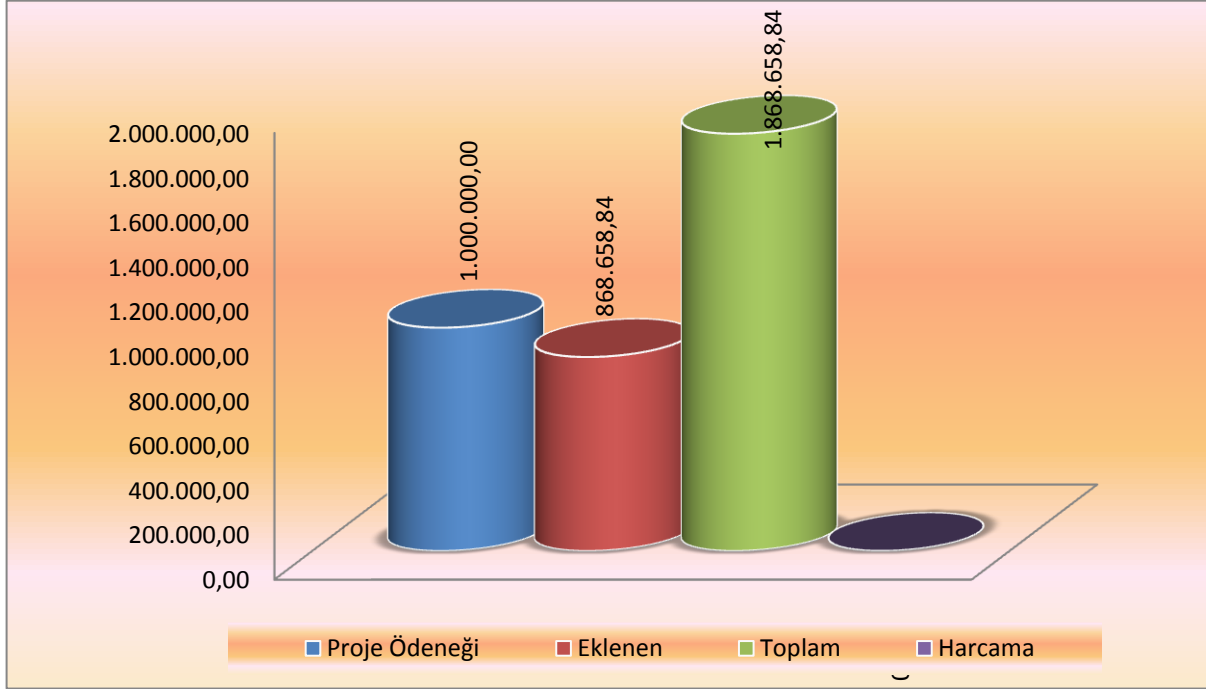

Şekil 7. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Proje No:2010H050110) Gerçekleşme Grafiği

2015 yılında açık ve kapalı spor tesislerinin yapımı amacıyla 2010H050110 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam ₺1.000.000,00 tutarındaki ödeneye yıl içinde ₺868.658,84 ödenek eklenerek toplam ödenek ₺1.868.658,84 olmuştur. Söz konusu ödenekten harcama yapılmamıştır.

✚ Dönem sonu itibariyle henüz fiziki gerçekleşme sağlanamamıştır.


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Önerileri

1. Kamu yatırımlarını üstlenecek gerçek ya da tüzel kişilerin belirli bir kurumsal güce (ekonomik, teknik vb. kriterler bakımından) ulaşmaya kadar kamu ihalelerine girmelerini engelleyecek tedbirler belirlenip uygulanmalıdır.
2. İmalat sektörü sıkı denetim altına alınarak kalitesiz ürünün piyasaya arzı engellenmeli ya da aynı standart ve teknik özellik adı altında piyasaya arz edilmiş olan ürünler kendi içinde sınıflandırılmalı ve ihtiyaca göre sınıf ya da kalitenin talep edilmesi sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise kamu idarelerine suistimallerin önüne geçecek düzenlemeler yapılarak ürünlere ait marka isteme yetkisi verilmelidir.

3. Kamu idarelerine gerekli sınırları belirlemek şartıyla kendi gerçekleştirdikleri işlerde çalışacak kişilerin seçimi ve ücret belirlenmesi konusunda doğrudan yetki verilmelidir.

3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı)						
Proje No: 2015H030960						
Yılı	Proje Ödeneği (₺)	Revize Ödenek (₺)		Toplam (₺)	Harcama (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2015	7.421.000,00	187.300,00	0	7.608.300,00	6.822.817,86	90

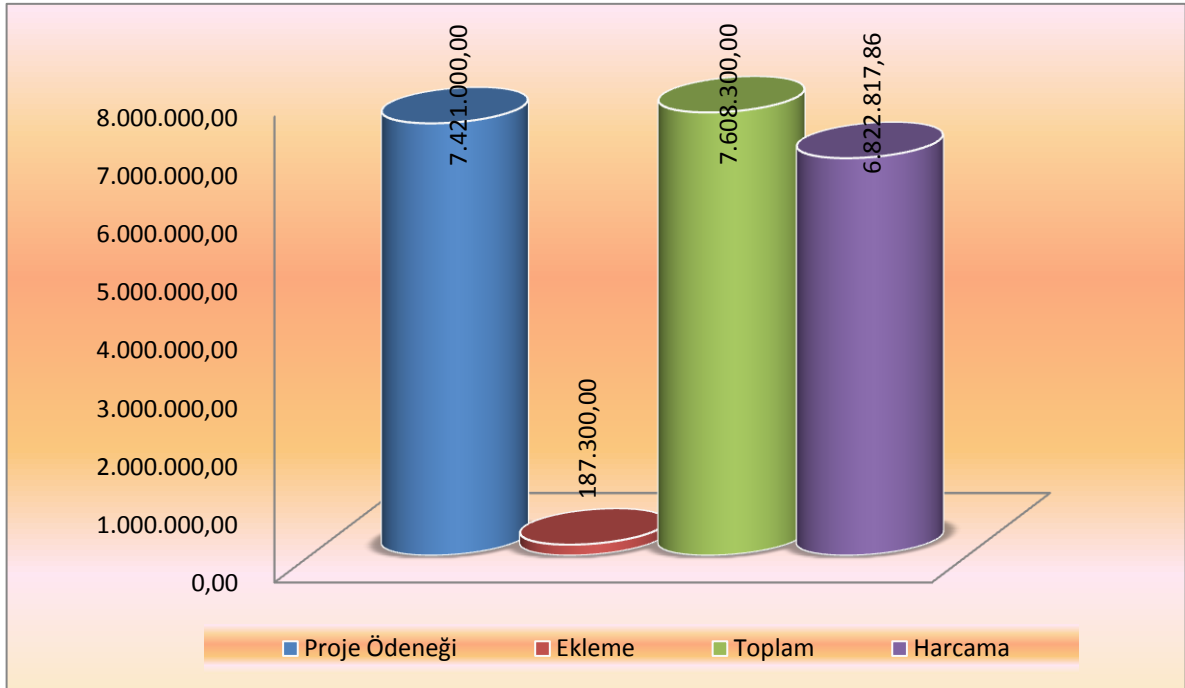

Şekil 8. Muhtelif İşler Projesi (Proje No: 2015H030960) Gerçekleşme Grafiği

2015 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat ve kara taşıtı alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2015H030960 nolu Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Projesi ile Üniversitemize ayrılan ₺7.421.000,00 tutarındaki ödeneye yıl içinde ₺187.300,00 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek ₺7.608.300,00 olmuştur. Bu ödenekten ₺6.822.817,86'si makine-teçhizat ve taşıtı alımı giderleri için kullanılarak %90 gerçekleşme sağlanmıştır.

Ayrıca 2015 yılı içinde ihalesi yapıldığı halde, ihale süreçlerinin uzamasından veya mal teslim sürelerinin çok uzun olmasından dolayı satın alma işlemi yapılan ancak yüklenici firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı 2 kalem malzeme (₺240.000) teslim alınamamıştır. Söz konusu iki malzemenin alın sürecinde sorun yaşanmamış olsaydı 2015 yılı toplam ödeneğin % 92,82'si kullanılmış olacaktı. Ayrıca Uluyazı Kampüsünde yapılan Kütüphane Binası inşaatının 2015 yılı sonuna kadar tamamlanmamış olmasından

dolayı tefrişat alımı gerçekleştirilememiştir. Kütüphane binası inşaatının tamamlanmasına müteakip tefrişat alımları gerçekleştirilecek, öğrenci ve personelimizin kullanımına sunulacaktır.


Anılan proje kapsamında;

- ✚ Üniversitemiz Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinde kullanılmak üzere 2015/47992 İhale Kayıt numaralı 35 Kalem “Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Malzemeleri Alımı” ihalesi kapsamında ₺729.977,50 ödenek kullanılmıştır.
- ✚ Üniversitemiz Yapraklı Meslek Yüksekokulunda kullanılmak üzere 2015/50887 İhale Kayıt numaralı 38 Kalem “Yapraklı Meslek Yüksekokulu Laboratuvar, Fitness, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Malzemeleri Alımı” ihalesi kapsamında ₺121.302,82 ödenek kullanılmıştır.
- ✚ Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunda, Kızılırmak Meslek Yüksekokulunda, Güzel Sanatlar Fakültesinde ve Orman Fakültesinde kullanılmak üzere 2015/50026 İhale Kayıt numaralı 47 Kalem “Meslek Yüksekokulu, Kızılırmak Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Orman Fakültesi Laboratuvar ve Muhtelif Malzeme Alımı” ihalesi kapsamında ₺575.804,60 ödenek kullanılmıştır.
- ✚ Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulunda ve Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda kullanılmak üzere 2015/52439 İhale Kayıt numaralı 92 Kalem “Sağlık Yüksekokulu Ve Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Laboratuvar Cihazları ve Muhtelif Malzeme Alımı” ihalesi kapsamında ₺256.260,60 ödenek kullanılmıştır.
- ✚ Üniversitemiz Uluyazı Kampüsünde kullanılmak üzere 2015/77008 İhale Kayıt numaralı 5 Adet “Jeneratör Alımı” ihalesi kapsamında ₺2.090.075,00 ödenek kullanılmıştır.
- ✚ Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Binasında ve Merkezi Laboratuvar Binalarında kullanılmak üzere 2015/81793 İhale Kayıt numaralı “Edebiyat Fakültesi ve Merkezi Laboratuvar Binaları İçin Değişken Soğutucu Akışkan Debili Klima Sistemi Alımı” ihalesi kapsamında ₺445.450,00 ödenek kullanılmıştır.
- ✚ Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunda, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde, Fen Fakültesinde, Güzel Sanatlar Fakültesinde, Sağlık Yüksekokulunda, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda, Orman Fakültesinde ve Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2015/89622 İhale Kayıt numaralı 13 Kalem “Elektronik Malzeme Alımı” ihalesi kapsamında ₺293.548,60 ödenek kullanılmıştır.

- ✚ Üniversitemiz Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda, Sağlık Yüksekokulunda, Mühendislik Fakültesinde, Güzel Sanatlar Fakültesinde, Meslek Yüksekokulunda, Yapraklı Meslek Yüksekokulunda ve Fen Fakültesinde kullanılmak üzere 2015/90027 İhale Kayıt numaralı 48 Kalem “Laboratuar Malzemesi Alımı” ihalesi kapsamında ₺288.395,40 ödenek kullanılmıştır.
- ✚ Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere 2015/135171 İhale Kayıt numaralı “2015 Model 19+1 Midibüs Alımı” ihalesi kapsamında ₺154.580,00 ödenek kullanılmıştır.
- ✚ Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere istenilen malzemeler (akıllı yazı tahta, mini buzdolabı, Traktör Römorku, Su tankı, Masaüstü bilgisayar, mini kazıyıcı-yükleyici, fotokopi makinası, yazıcı, klima, televizyon, mobilya vb) Devlet Malzeme Ofisi Aracılığı ile satın alınmış olup, toplam harcama ₺1.333.206,38’ dir.
- ✚ Üniversitemiz Rektörlük ve Bağlı Birimleri için doğrudan temin ve diğer alımlar kapsamında toplam ₺277.956,36 harcanmıştır.
- ✚ Üniversitemiz değişik birimlerine yapılan alımlara, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 06.1 mamul mal alımı hesabıyla toplam ₺6.822.817,86 harcama gerçekleştirilmiştir.

3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Yayın Alımı)						
Proje No: 2015H030970						
Yılı	Proje Ödeneği (₺)	Revize Ödenek (₺)		Toplam (₺)	Harcama (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2015	300.000,00	0	0	300.000,00	264.979,51	88

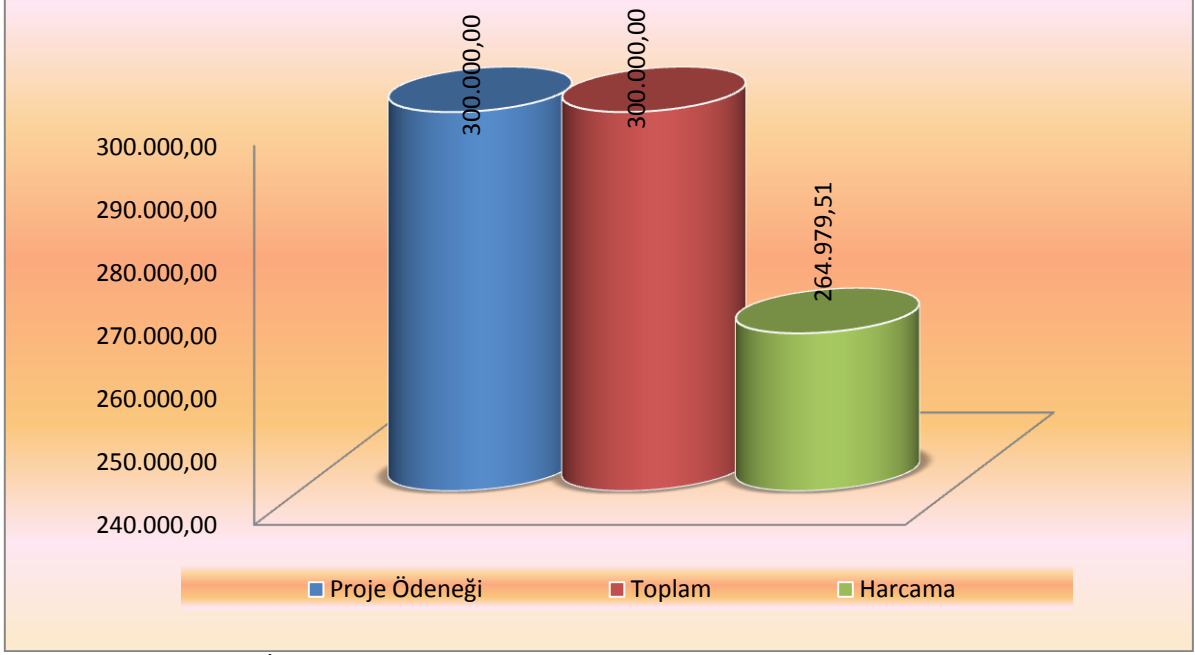

Şekil 9. Muhtelif İşler (Yayın Alımı) Projesi (Proje No: 2015H030970) Gerçekleşme Grafiği


2015 yılında 2015H030970 nolu Muhtelif İşler (Yayın Alımı) projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam ₺300.000,00 tutarındaki ödeneğin ₺264.979,51'si yayın alımı giderlerinde kullanılarak %88 gerçekleşme sağlanmıştır. Bu kapsamda abone olunan tam metin veri tabanları;

1. Jstor Koleksiyonları
2. Hukuktürk Mevzuat Bilgi Bankası
3. Wiley Online Library
4. İktisat İşletme Finans Dergisi
5. World E-Book Library (WEL) e-Kitaplar
6. Ebrary E- Kitap veri tabanı
7. HiperKitap e- Kitap veri tabanı
8. Scifinder Chemical Abstracts Service
9. MathSciNet indeksi
10. Ebsco Discovery Service (EDS) keşif Aracı
11. EndNote (Bilimsel yazı düzenleme aracı)
12. DeepKnowledge Proxy servisi
13. Turnitin İntihal Analiz Aracı

Kullanılan ödeneğin ₺10.303,00 tutarındaki kısmı ile akademik birimlerin ihtiyacı olan basılı ders kitapları ve temel koleksiyon için kültür kitapları alınmıştır. Akademik birimlerimizin yüksek miktarda basılı yayın talepleri olmasına rağmen kütüphanemizin fiziksel mekânı yeterli olmadığından dolayı ihtiyaçların karşılanabilmesi için elektronik yayın aboneliklerine ağırlık verilmiştir.

3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı)						
Proje No: 2015H030960						
Yılı	Proje Ödeneği (₺)	Revize Ödenek (₺)		Toplam (₺)	Harcama (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2015	576.000,00	450.000,00	0	1.026.000,00	465.505,28	45

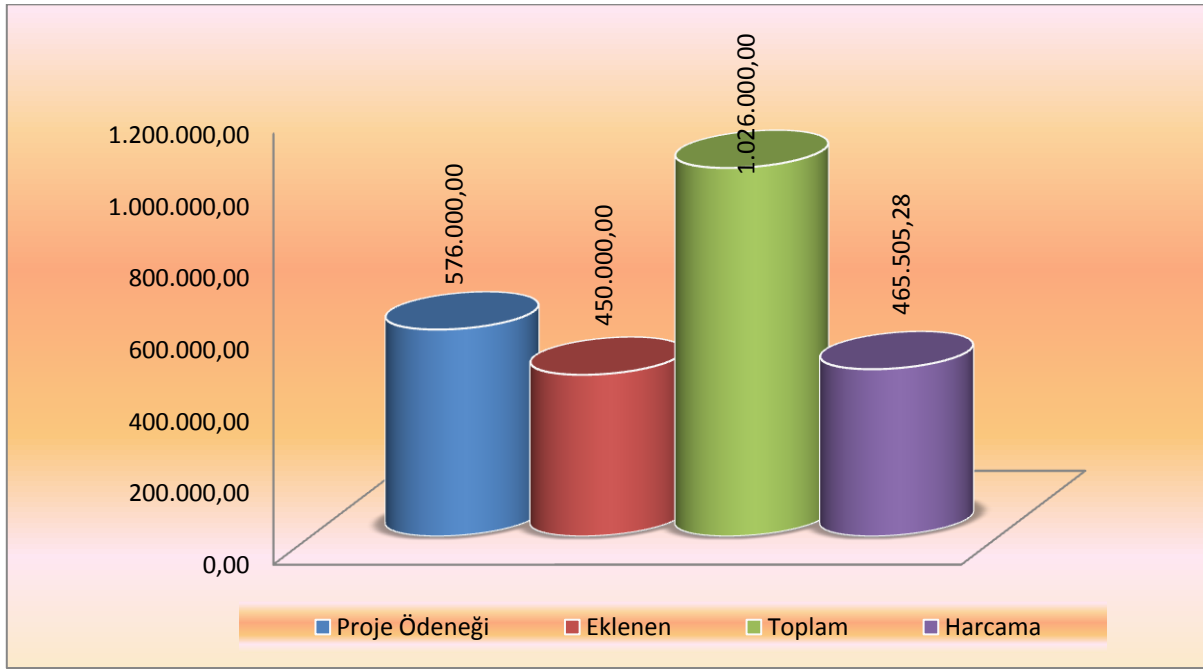

Şekil 10. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı) Projesi (Proje No: 2015H030960) Gerçekleşme Grafiği


2015 yılında 2015H030960 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile donanım alımları için Üniversitemize ayrılan ₺576.000,00 tutarındaki ödeneye yıl içinde ₺450.000,00 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek ₺1.026.000,00 olmuştur. Söz konusu ödenekten ₺465.505,28'si bilgi işlem cihazları alımında kullanılarak %45 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

- ✚ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda kullanılmak üzere PVC Kart Yazıcı ve Sarf Malzemeleri temin edilmiş ve ₺9.188,66 harcanmıştır.
- ✚ Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Binasının kablolama işlerinde kullanılmak üzere Network Kablosu, Kablo Kanalı ve ekipmanları temin edilmiş ₺7.534,30 harcanmıştır.
- ✚ Üniversitemiz Veri Kurtarma Merkezi'nde kullanılmak üzere 1 Adet Şase Tipi Anahtar, 3 Adet Şase Tipi Anahtarlar İçin Modül, 1 Adet Ağa Bağlı Depolama Birimi

(NAS), 1 Adet NAS Cihazlar İçin 10 GBit Ethernet Modül, 450 metre Cat6 Kablo ve 2000 adet Kablo Konnektörü temin edilmiştir.

- Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 15 Adet Kablosuz Erişim Noktası, 5 Adet Kablosuz IP Telefon, 50 Adet Masaüstü IP Telefon, 2 Adet Dış Ortam Kablosuz Haberleşme Cihazı, 2 Adet Dış Ortam Kablosuz Haberleşme Cihazı Anteni temin edilmiş ve ₺448.782,32 harcanmıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı)						
Proje No: 2015H030960						
Yılı	Proje Ödeneği (₺)	Revize Ödenek (₺)		Toplam (₺)	Harcama (₺)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2015	155.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00	184.324,60	99

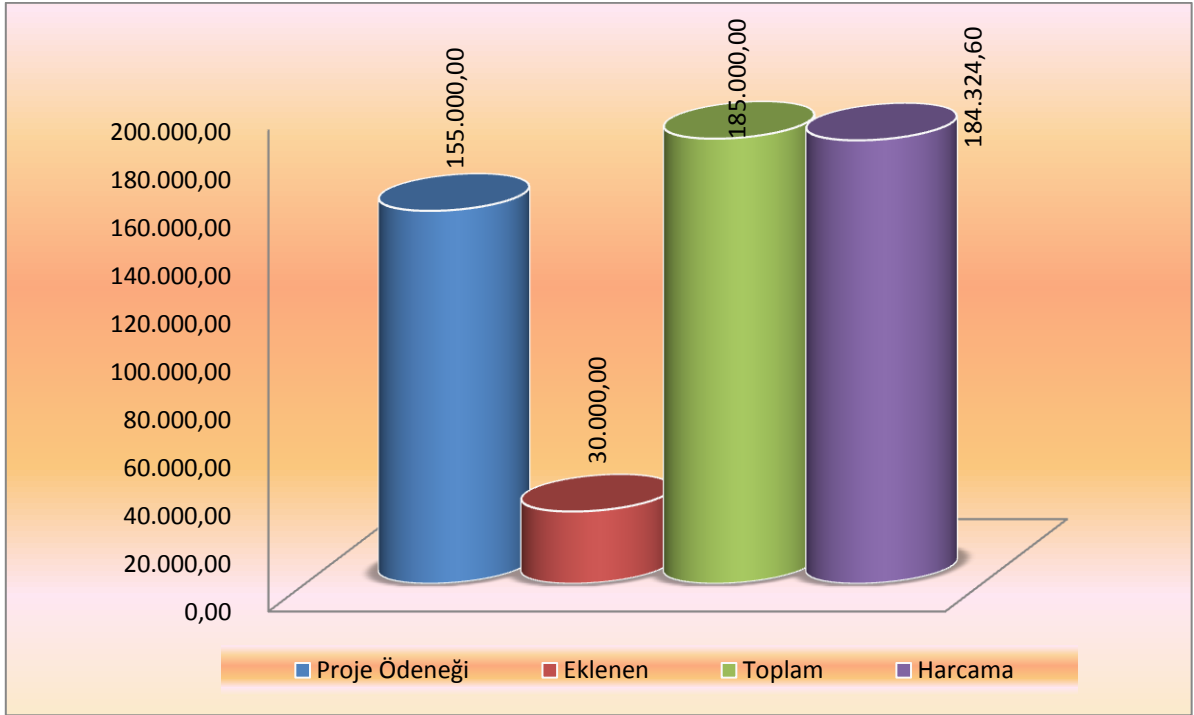

Şekil 11. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı) Projesi (Proje No: 2015H030960) Gerçekleşme Grafiği

2015 yılında 2015H030960 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile yazılım alımları için Üniversitemize ayrılan ₺155.000,00 tutarındaki ödeneye yıl içinde ₺30.000,00 ödenek eklenmiş, toplam ödenek ₺185.000,00 olmuştur. Söz konusu ödenekten ₺184.324,60'si kullanılarak %99 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında;

- ✚ Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne ait 1 yıllık Bakım ve Güncelleme Sözleşmesi kapsamında ₺28.320,00 harcanmıştır.
- ✚ Üniversitemizde göreve başlayan personelimiz için Nitelikli Elektronik Sertifika ve Kart Okuyucu temini için ₺22.575,32 harcanmıştır.
- ✚ Güzel Sanatlar Fakültesi bilgisayar laboratuvarlarında kullanılmak üzere "Müzik Prodüksiyon Yazılımı" temini için ₺39.863,80 harcanmıştır.
- ✚ BAP Birimimiz tarafından kullanılan otomasyon yazılımına ait Bakım ve Destek Sözleşmesi kapsamında ₺5.000,00 harcanmıştır.
- ✚ Üniversitemiz birimlerinde kullanılan bilgisayarlar için Antivirüs Güvenlik Yazılımı temini için ₺18.408,00 harcanmıştır.
- ✚ Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından kullanılan Firewall (Güvenlik Yazılımı) için LOG Raporlama Sistemi temini için ₺19.470,00 harcanmıştır.
- ✚ IP Telefon Log Sunucu ve destek eğitim paketi temini için ₺3.540,00 harcanmıştır.

4. ÖNERİLER

Kuruluşundan itibaren oluşturduğu pozitif enerji ve dinamik idari yapı sayesinde emsali paydaşlarının önünde gitmeyi ilke edinen Üniversitemiz kurumsal sistemini güçlü temeller üzerine inşa etmesi sayesinde bugün bulunduğu başarı düzeyini yakalamıştır. Başarıda devamlılığı sağlamak ve sürdürülebilir kalite politikası oluşturmak ancak sistematik çalışmayla sağlanabilecek hususlardır. Bu hususlarda gösterilen performans kuruluşumuzdan itibaren izlediğimiz kurumsal politikalar sayesinde fiziki görüntüye bürünerek Uluyazı Yerleşkesi olmuştur. Hizmete alınmasını müteakip Üniversitemizin fiziki ve sosyal mekân yetersizliğinin giderilmesinde önemli bir rol üstlenen Uluyazı Yerleşkesi hızla geliştirilmeye devam edilmektedir. Anılan yerleşkemiz eğitim-öğretim alanlarının araç trafiğine kapalı olması, engellilerin engelsiz ulaşabileceği eğitim alanlarının oluşturulması, modern sportif tesislerin yer alması ve daha sayılabilecek birçok özelliği bünyesinde bulundurması yanında ihtiyaç duyulan kaynaklara zamanında ulaşılmasının kamu yatırım politikaları açısından ne denli önem arz ettiğinin de bir göstergesini oluşturmaktadır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak sahip olduğumuz misyonu daha da ileri taşımak ve geliştirmek amacıyla edindiğimiz vizyonumuz kapsamında güçlü bir kurumsal yapı oluşturmamız hizmetlerimizin etkililiğini artırmıştır. Ancak kurumsallaşma noktasında eksik kalan hususların ivedilikle tamamlanarak kurumsal gelişimin aksatılmadan sürdürülmesi önemli bir husus oluşturmaktadır. Bunun için eksik fiziki mekânların tamamlanması, zayıf yönlerimizin güçlendirilmesi, personel istihdam ve görevlendirme politikalarımızın sistematikleştirilmesi gerekmektedir. Yine kurumsal koordinasyon ve aidiyet duygusunu geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmaların da daha sağlam bir yapı üzerine inşa edilmiş bir üniversite oluşturacağı unutulmamalıdır.

Geriye dönüp baktığımızda 4.000'lerden 13.000'lere çıkmış bir öğrenci, 10 milyondan 100 milyona çıkmış bir bütçe, kendisine ait hiçbir binası bulunmadığı halde modern bir kampüs oluşturmuş bir üniversite karşımıza çıkmaktadır. Yedi yıl önce 170 olan personel sayısı bugün 1000'i geçmiş ise ve gözle görülür bir başarı elde edilmişse bunda en büyük payın özverisini esirgemeyen ve sistemli çalışan personelde olduğu unutulmamalı, personelin gayret ve şevkini artırıcı tedbirler alınmalı, gerekiyorsa ödüllendirme yapılması için kurumsal düzeyde girişimlerde bulunulmalıdır.

Biz Karatekin ailesi olarak paydaşlarımızla birlikte, emin adımlarla, misyonumuzun ve vizyonumuzun bilinci içerisinde geleceğe doğru yol alan genç ve dinamik bir üniversite olmanın gereklerini yerine getirirken üzerine sorumluluk düşen her bir kurum ve kişinin de gereken sorumlulukları zamanında yerine getirerek bizlere destek olacağına ümidini taşımaktayız. Çıkılan bu yolculukta kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluklarını en güzel şekilde yerel paydaşlarımıza yansıtarak örnek bir kurum olmak için her türlü desteği vermeye de hazırız.

Yapılan açıklamalar kapsamında zayıf yönlerimizi güçlendirmek, güçlü yönlerimizin sürekliliğini sağlamak, fırsatları faydaya dönüştürerek hedeflerimize en kısa sürede ve en düşük maliyetle ulaşabilmek arzusundayız. Tespit ettiğimiz ve edemediğimiz engelleyici bürokrasi ile eksikliklerimizi de en kısa sürede aşarak bireylerinin mensup olmaktan mutluluk duyacağı bir kurum olma yolunda geride kalan 2015 yılına ait "Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu"muzun kamuoyunun ve ilgili kurumların bilgi ve takdirlerine saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ
Rektör

5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU

Kurum Adı : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE

2015 Yılı Fiyatlarıyla, BİN (₺)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		22.000		19.802	19.802		22.000	22.000		32.453	32.453		26.218	26.218
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	6		22.000		19.802	19.802		22.000	22.000		32.453	32.453		26.218	26.218
