



Çankırı Karatekin Üniversitesi

**2017 YILI YATIRIM İZLEME
VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

İÇİNDEKİLER

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	- 1 -
2. GENEL DEĞERLENDİRME	- 2 -
2.1. Üniversitemizin Misyonu.....	- 2 -
2.2. Üniversitemizin Vizyonu	- 2 -
2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri	- 2 -
2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları	- 3 -
2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu	- 3 -
2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi.....	- 4 -
2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı	- 5 -
2.8. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	- 6 -
3. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI.....	- 7 -
3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	- 7 -
3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	- 11 -
3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	- 13 -
3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	- 14 -
4. ÖNERİLER.....	- 18 -
5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU.....	19-



1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

*Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen **Çankırı Karatekin Üniversitesi**; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi, bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.*

Üniversitemiz, bu amacına ulaşmak için en son teknolojik makine ve teçhizatlarla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim – öğretim vermek ve hedeflenen amaca ulaşan araştırmalar yapmak üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaktadır.

*Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 25' inci ve 60' ıncı maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24' üncü maddesi uyarınca, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz **Üniversitemiz 2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunu** ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.*

Prof. Dr. Hasan AYRANCI
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Üniversitemizin Misyonu

Eğitim-öğretim ve arařtırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydař memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleřtirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiřtirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiřtir.

2.2. Üniversitemizin Vizyonu

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve arařtırmada öncü; öğrenciler ve arařtırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediđi bir kurum olmaktır.

2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2017-2021 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler ařađıda yer almaktadır.

AMAÇ 1: Eğitim Ve Öğretimin Kalitesini Artırmak

HEDEF 1: Eğitim Öğretimin Nitelik ve Niceliđini Geliřtirmek

HEDEF 2: Fiziki Altyapıyı Güçlendirmek

HEDEF 3: Akademik Personelin Nitelik ve Niceliđini Artırmak

HEDEF 4: İdari Personelin Nitelik ve Niceliđini Belirlemek

AMAÇ 2: Bilimsel Ve Sanatsal Arařtırma Faaliyetlerini Geliřtirmek

HEDEF 1: Bilimsel Faaliyetleri Artırmak

HEDEF 2: Sanatsal ve Kültürel Faaliyetleri Artırmak

HEDEF 3: Arařtırma Faaliyetlerinin Nitelik ve Niceliklerini Artırmak

HEDEF 4: Ticarileřtirilebilir Nitelikte Ürün Geliřtirmek

HEDEF 5: Bilim Uygulama Merkezi Kurmak

AMAÇ 3: Diş Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek**HEDEF 1:** Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak**HEDEF 2:** Üniversite Halk İletişimini Geliştirmek**HEDEF 3:** Yerel Kaynakları Değerlendirmek ve Geliştirmek**HEDEF 4:** Yerel İhtiyaçlara Yönelik Çalışmalar Yapmak**2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz ağırlıklı olarak öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2017 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir tahminleri;

a) Hazine yardımları	: 106.078.000,00 TL
b) Öz gelirler	: 4.864.000,00 TL

olmak üzere toplamda **110.942.000,00 TL**' dir.

Üniversitemizin 2017 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan eklemelerle bu ödenek 134.560.550,55 TL olmuş, söz konusu ödeneğin 41.407.000,00 TL'si yatırım giderlerinin finansmanı için tahsis edilmiştir. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır.

2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

GELİRİN EKONOMİK KODU	PLANLANAN GELİR (TL)	GERÇEKLEŞEN GELİR (TL)
03.1.1.01	16.000,00	1.960,00
03.1.2.03	5.000,00	233,25
03.1.2.29	265.000,00	198.022,80
03.1.2.31	2.210.000,00	3.085.758,42
03.1.2.32	0,00	241.667,30
03.1.2.33	11.000,00	0,00
03.1.2.34	53.000,00	55.183,00
03.1.2.35	10.000,00	0,00
03.1.2.36	0,00	152.650,00
03.1.2.38	80.000,00	14.355,22
03.1.2.48	0,00	25.000,00
03.1.2.98	0,00	7.060,87

2017 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

03.1.2.99	739.000,00	1.134.129,00
03.6.1.01	16.000,00	56.050,95
03.6.1.03	45.000,00	0,00
03.6.1.99	20.000,00	271.571,34
03.6.9.99	0,00	3.285,00
04.2.1.01	77.578.000,00	67.289.301,01
04.2.2.01	28.500.000,00	17.951.000,00
04.4.1.02	0,00	500,00
04.4.1.04	0,00	1.849,50
05.1.9.01	0,00	127,36
05.1.9.99	0,00	13.883,25
05.2.6.16	49.000,00	107.547,24
05.3.2.99	5.000,00	163.612,61
05.3.9.99	0,00	33.463,02
05.9.1.06	0,00	86.460,14
05.9.1.19	1.340.000,00	1.616.139,00
05.9.1.99	0,00	138.656,83
	110.942.000,00	92.649.467,00

Ayrıca 11.907.000,00 TL tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları kullanılarak yatırım bütçesinde ödenekleştirilmiştir.

2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemiz Arsa Oturum Dağılımı (m²)

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Uluyazı Yerleşke Alanı	-	2.080.899,42	-	2.080.899,42	Tahsisli
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	-	855	855	Tahsisli
Balıca Yerleşkesi	-	64.090	-	64.090	Tahsisli
Orman Fakültesi	-	-	5.260	5.260	Tahsisli
Sağlık Bilimleri Fakültesi	-	22.878	-	22.878	Tahsisli

Güzel Sanatlar Fakültesi	-	-	4.204	4.204	Kira
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu		-	4.015	1140	Tahsisli
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	23.552	-	23.552	Tahsisli
Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	385.074	-	385.074	Tahsisli

2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3. Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m²)	
Bina Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²)
	Üniversite
Eğitim Binası	80.047
Laboratuvar Binası	3.000
Yemekhane	9.500
Lojman	4.037
Spor Salonu	11.427
Sosyal Tesis	1.228
İdari Bina	8.816
Merkezi Kütüphane	9.392


2.8. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarı olarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Sektör	2017 Yılı KBÖ (TL)	2017 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi (TL)	Oran (%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	24.000.000,00	6.116.129,72	25,48
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	3.000,000,00	0,00	0,00
DKH-Sosyal- Teknolojik Araştırma	1.500.000,00	1.400.000,00	93,93
Toplam	28.500.000,00	7.516.129,72	26,37

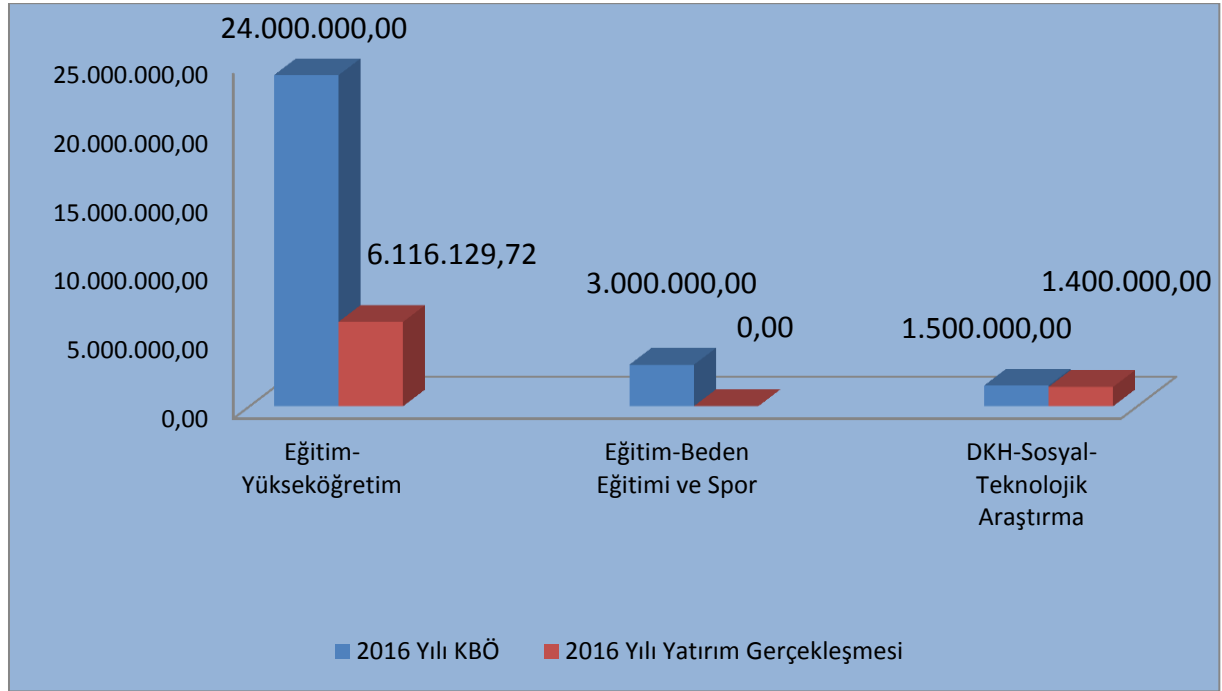

Şekil 1. 2017 Yılı Genel Yatırım Uygulama Grafiği

2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

EKO. KOD	AÇIKLAMA	2017 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2017 YILI EKLENEN ÖDENEK (TL)	2017 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK (TL)	2017 YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	6.142.000,00	2.400.000,00	0,00	8.542.000,00	6.057.106,95
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	134.913,46
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	21.600.000,00	11.907.000,00	1.400.000,00	32.107.000,00	765.434,14
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	558.675,17
	TOPLAM	28.500.000,00	14.307.000,00	1.400.000,00	41407.000,00	7.516.129,72

3. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi						
Proje No: 2017H030370						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2017	100.000,00	0	0	100.000,00	0	-

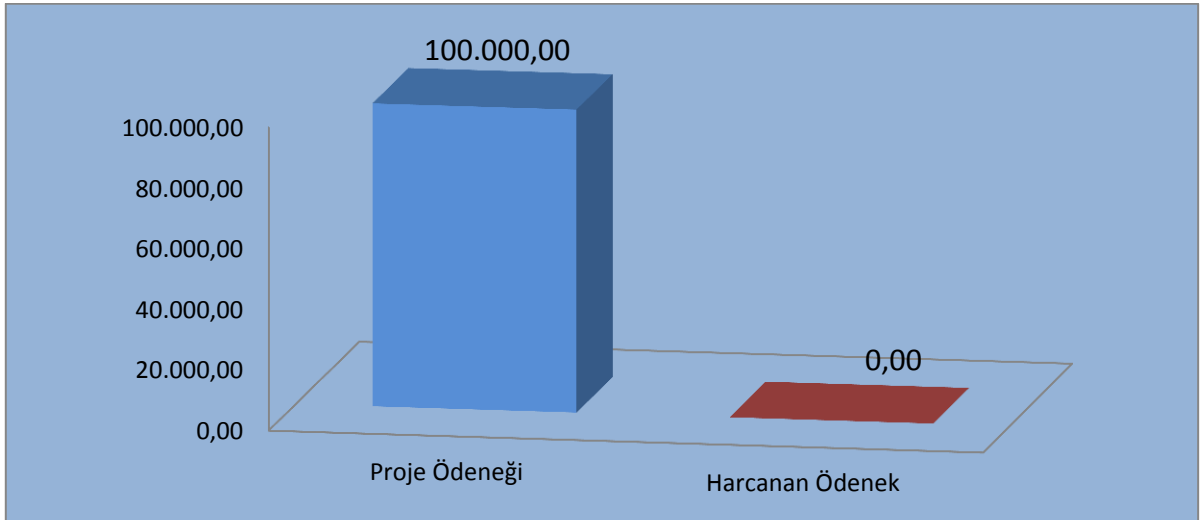


Şekil 2. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Proje No: 2017H030370) Gerçekleşme Grafiği

2017 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2017 yılında Uluyazı Kampüs alanı etüt-proje işlerinin gerçekleştirilebilmesi ve 2017H030370 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi kapsamında projelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için Üniversitemize ayrılan proje ödeneği toplam 100.000,00 TL olup 2017 yılı içerisinde harcama yapılmamıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)						
Proje No: 2017H030380						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2017	623.000,00	0	0	623.000,00	558.675,17	89,67

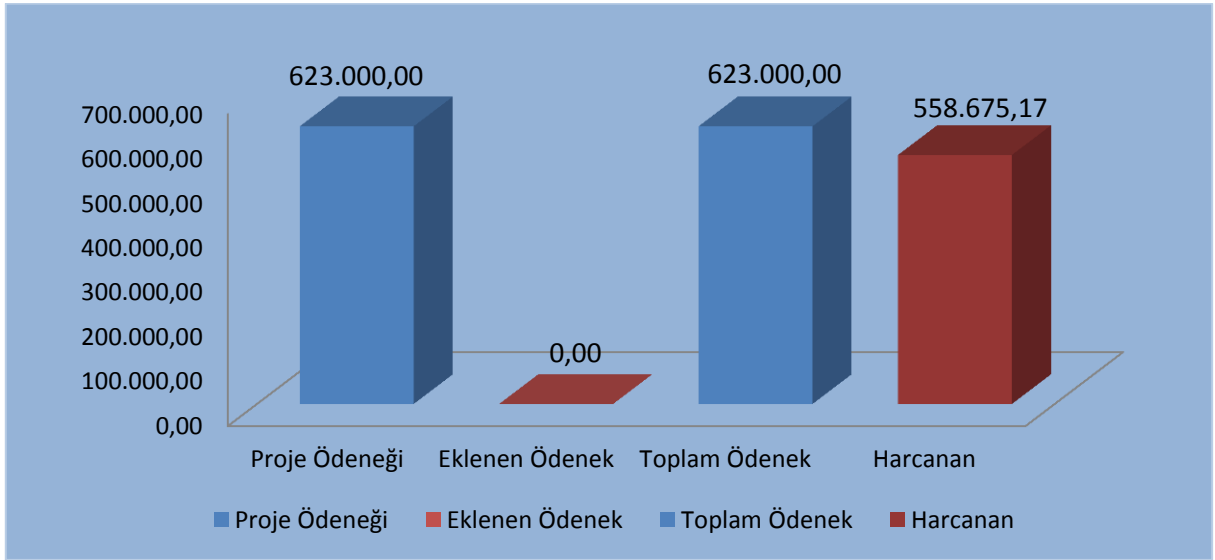

Şekil 3. Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesi (Proje No: 2017H030380) Gerçekleşme Grafiği


2017 yılında 2017H030380 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 623.000,00 TL tutarındaki ödeneğin, 558.675,17 TL' si kullanılarak % 89,67 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında Şehir Kampüslerinde:

- Eldivan Sağlık MYO da mutfak, bekleme salonu ve lavabo yaptırılmıştır.
- Meslek Yüksek Okulunda bulunan trafo, aşırı yük binmesi nedeniyle yenilenmiştir.
- Balıca kampüsünde bulunan doğalgaz kazanı onarılmıştır.
- Fen Fakültesinde İklim odası ve rektörlük binasında depo yaptırılmıştır.
- İİB Fakültesinde bulunan kantin davlumbazı ve tuvalet su tesisatları onarılmıştır.
- Tüm binalarda bulunan yangın ihbar sistemi kontrolden geçirilmiştir.
- Ilgaz Turizm Yüksekokulunda bulunan şönt reaktör ve kampanzasyon tadilatı yapılmıştır.
- YİDB bulunan makam odası yenilenmiştir.

- Uluyazı kampüsünde bulunan sera, hava şartlarından hasar görmesi dolayısıyla tamir edilmiştir.
- Uluyazı kampüsünde bulunan seraya çelik profil ile ek güçlendirme yapılmıştır.
- Sosyal tesiste bulunan bürolar odalara çevrilmiştir.
- Kütüphane B14 mahalinde bulunan odanın ısı kaybı yaşaması sebebiyle yalıtım yapılmıştır.
- Spor kompleksi binasına çelik karkas yaptırılmıştır.
- Büyük onarım kapsamında; MYO, Orman Fakültesi, Balıca Derslik binası ve Uluyazı kampüsü merkezi dersliklerde çatı onarımları yapılmıştır.
- Eldivan Meslek Yüksekokulu' nda bulunan depo; laboratuvar, engelli wc, abdesthane ve drama odasına çevrilmiştir.
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' nde bulunan tuvaletlerde seramikler onarılmıştır.
- Meslek Yüksekokulu' nda tüp odası yapılmıştır.
- Meslek Yüksekokulu' nda bulunan atölye onarılmıştır.
- Mühendislik Fakültesi' nde bulunan makam odası tadilat yapılmıştır.

Proje Adı: Kampüs Altyapısı						
Proje No: 2009H030810						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2017	7.000.000,00	7.394.000,00	0	14.394.000,00	765.434,14	5,32

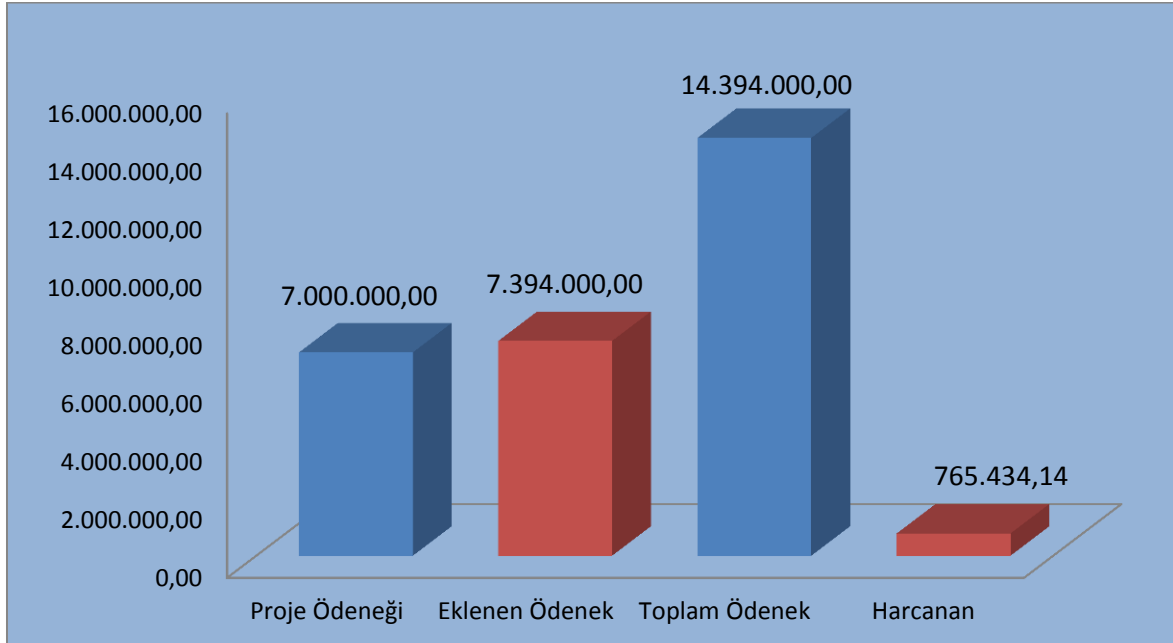

Şekil 4. Kampüs Altyapısı Projesi (Proje No:2009H030810) Gerçekleşme Grafiği

2017 yılında Uluyazı kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2009H030810 nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 7.000.000,00 TL tutarındaki


2017 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

ödeneğe yıl içinde 7.394,00,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam 14.394.000,00 TL ödeneğin 765.343,14 TL'si Kampüs Altyapısı Projesinde kullanılarak % 5,32 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında Uluyazı Kampüsünde:

- 15.798,00 m² andezit döşeme kaplaması,
- 3.820,00 m² andezit merdiven basamağı kaplaması yaptırılmıştır.


Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler						
Proje No: 2009H030820						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2017	10.000.000,00	2.643.000,00	0	12.643.000,00	0	-

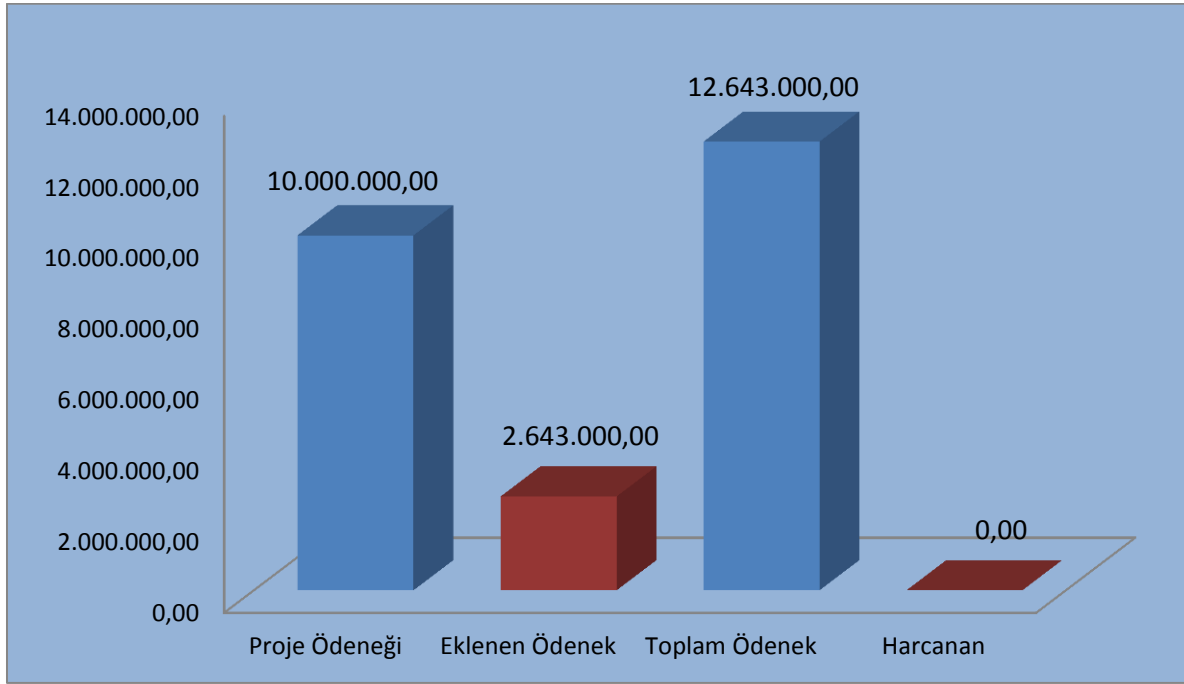

Şekil 5. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Proje No:2009H030820) Gerçekleşme Grafiği

2017 yılında 2009H030820 nolu derslik ve merkezi birimler projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 10.000.000,00 TL tutarındaki ödeneğe yıl içinde 2.643.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam 12.643.000,00 TL olmuştur. Söz konusu ödenekten harcama yapılmamış olup, “Edebiyat Fakültesi 2. Etap Bina İnşaatı” ihalesi sözleşme aşamasına getirilmiştir.

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
Proje No: 2010H050110						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2017	3.000.000,00	1.870.000,00	0	4.870.000,00	0	-

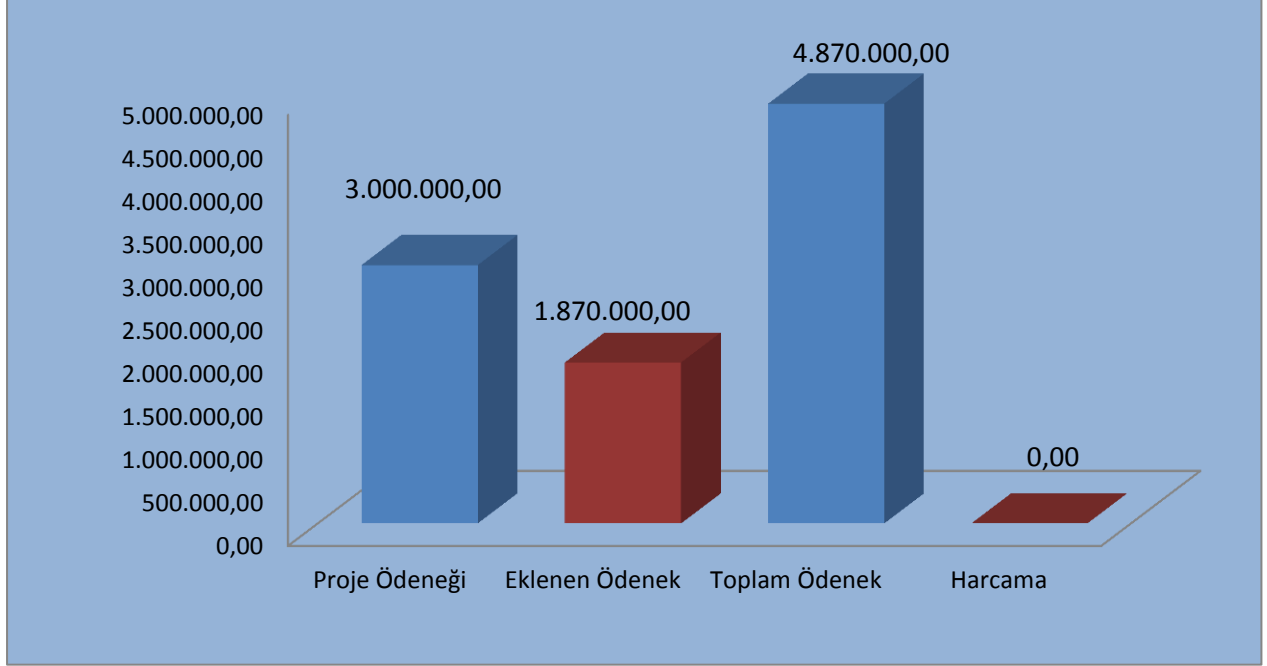


Şekil 6. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Proje No:2010H050110) Gerçekleşme Grafiği

2017 yılında açık ve kapalı spor tesislerinin yapımı amacıyla 2010H050110 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 3.000,00 TL tutarındaki ödenğe yıl içinde 1.870.000,00 TL ödenek eklenerek toplam ödenek 4.870.000,00 TL olmuştur. Yapılması planlanan açık spor tesisleri işi tasfiye edilmesi nedeniyle söz konusu ödenekten harcama yapılmamıştır.

3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı)						
Proje No: 2017H030380						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2017	4.458.000,00	0,00	0,00	4.458.000,00	2.961.692,35	66,44

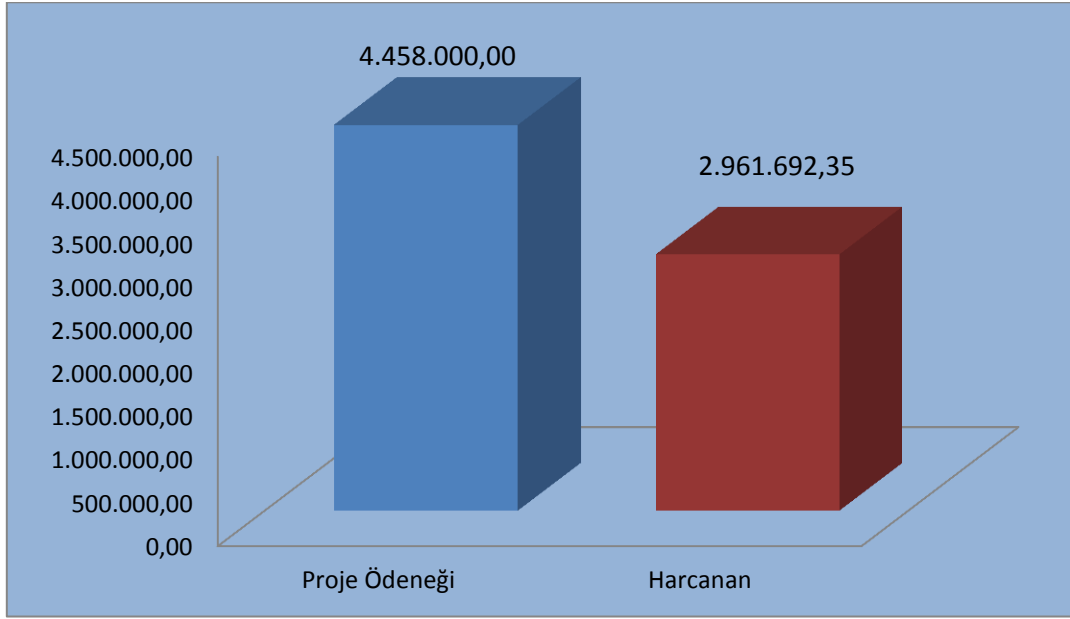

Şekil 7. Muhtelif İşler Projesi (Proje No: 2017H030380) Gerçekleşme Grafiği

2017 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat ve kara taşıtı alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2017H030380 nolu Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Projesi ile Üniversitemize ayrılan 4.458.000,00 TL tutarındaki ödenekten 2.961.692,35 TL'si makine-teçhizat ve taşıt alımı giderleri için kullanılarak % 66,44 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Projesi için kullanılan ödeneğin % 31,61'si okul mefruşatı ve büro mefruşatı, % 47,55'i laboratuvar cihazları, % 1,11'i Avadanlık Alımları, % 19,73'ü de büro makinaları ile diğer cihaz ve teçhizat alımları için yapılmıştır.

Proje kapsamında yapılan alımlar;

Tablo 6. Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Projesi Kapsamında Yapılan Alımlar

2017 YILI YAPILAN İHALELER								
İhale Kayıt Numarası	İhalenin Adı	İhale Tarihi	İhale Türü	İhale Usulu	Yaklaşık Maliyet (TL)	Sözleşme Bedeli (TL)	İhale Durumu	
1 2017/146841	128 KALEM LABORATUAR , ELEKTRONİK, YEMEKHANE, BAHÇE MOBİLYALARI VE MUHTELİF MALZEME ALIMI	03/05/2017	Mal	Açık	2.126.309,14	1.455.464,32	Sözleşme imzalandı.	

128 kalem laboratuvar , elektronik, yemekhane, bahçe mobilyaları ve muhtelif malzeme alımı yapılmış olup, KDV dahil **1.717.447,90** TL harcanmıştır.

DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO)


Tablo 7. DMO Yoluyla Alınan Taşınırların Birimlere Göre Dağılım

İstek yapan birim	Harcama Tutar
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	250.284,14 TL
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı	371.812,23 TL
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	11.766,29 TL
Sağlık Bilimler Fakültesi	3.656,88 TL
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu	13.673,12 TL
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	76.101,41 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	10.706,47 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi	17.312,83 TL
Meslek Yüksekokulu	23.104,89 TL
GENEL TOPLAM	778.418,26 TL

- Doğrudan temi usulüyle Rektörlük ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere **465.826,19** TL harcama yapılmıştır.

3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Adı: Yayın Alımı						
Proje No: 2017H030390						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2017	650.000,00	1.000.000,00	0	1.650.000,00	661.639,41	40,10

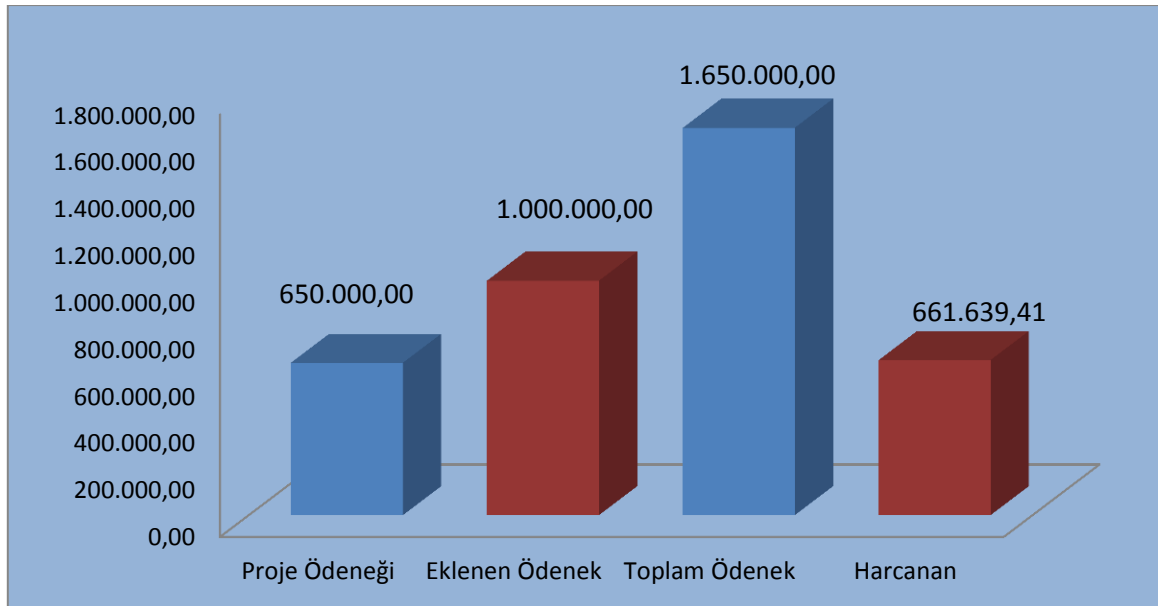

Şekil 8. Yayın Alımı Projesi (Proje No: 2017H030390) Gerçekleşme Grafiği

2017 yılında 2016H031960 nolu Yayın Alımı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 650.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 1.000.000,00 TL ödenek eklenmiş ve toplam 1.650.000,00 TL ödeneğin 661.639,41 TL'si yayın alımı giderlerinde kullanılarak % 40,10 gerçekleşme sağlanmıştır.

2017H030390 Yayın Alımı Projesi kapsamında;

Üniversitemiz 2017 Yayın alımları projesi için 2017 yılı bütçesinde, 650.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 16.539,41 TL tutarındaki kısmı ile 2 adet yeni veri tabanı aboneliği yapılmış; 434.100,00 TL ile mevcut elektronik yayınların abonelik bedelleri ödenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki listede belirtilen elektronik veri tabanlarına abonelikler gerçekleştirilerek bedeli ödenmiştir.


Abone olunan tam metin veri tabanları ve elektronik ortamda sağlanan ürünler,

1. JSTOR Koleksiyonları
2. Hukuktürk Mevzuat Bilgi Bankası
3. Wiley Online Library
4. World E-Book Library (Wel) E-Kitaplar
5. Ebrary E- Kitap Veri Tabanı
6. Hiperkitap E- Kitap Veri Tabanı
7. Scifinder Chemical Abstracts Service
8. Mathscinet İndeksi
9. Emerald Journals
10. ACS Journals
11. ViDOBU Video eğitim Portalı
12. SOBİAD Sosyal bilimler atıf İndeksi
13. Ebsco Discovery Service (EDS) keşif Aracı
14. EndNote (Bilimsel yazı düzenleme aracı)
15. DeepKnowledge Proxy Servisi
16. Turnitin İntihal Analiz Aracı

Ödeneğimizin 211.000,00 TL tutarındaki kısmı ile Akademik birimlerin ihtiyacı olan basılı ders kitapları ve temel koleksiyon için kültür kitapları olmak üzere toplam 6628 adet yayın satın alınmıştır.

3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı)						
Proje No:2017H030380						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2017	1.034.000,00	0	0	1.034.000,00	1.033.775,19	99,98



Şekil 9. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım) Projesi (Proje No: 2017H030380) Gerçekleşme Grafiği

2017 yılında 2017H30380 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile donanım alımları için Üniversitemize ayrılan 1.034.000,00 TL tutarındaki ödeneğin 1.033.775,19 TL'si bilgi işlem cihazları alımında kullanılarak %99,98 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2017 yılı içerisinde Üniversitemiz akademik ve İdari birimlerinden güncel malzeme talepleri alınmış ve ödenek imkanları ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak bu malzemelerin temini yoluna gidilmiştir.

2017 yılında Birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulduğu belirtilen bilişim malzeme talepleri üzerinde, ödeneğimiz ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak, yapılan düzenleme çerçevesinde 955.117,99 TL tutarındaki aşağıdaki listede yer alan bilişim malzemelerinin alımı, DMO üzerinden gerçekleştirilmiştir. Anılan malzemeler ile Meslek Yüksekokulu ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bilgisayar laboratuvarlarında yenileme çalışması yapılmıştır. Kütüphane binasında ise yeni bir bilgisayar Laboratuvarı oluşturulmuştur. Üniversitemizde yeni açılan birimlerin bilişim malzeme ihtiyaçları da giderilmiştir. Kütüphane binasında kullanılmak üzere doğrudan temin yolu ile bir adet APPLE IMAC I5 bilgisayar 6.136,00 TL tutarındaki ödenek ile temin edilmiştir.

Tablo 8. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi İle Yapılan Alımlar


S.N.	Ürün Adı	Birim	Miktar
1	BİLGİSAYAR	Adet	203
2	MONİTÖR	Adet	204
3	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	Adet	37
4	YAZICI	Adet	28
5	RENKLİ YAZICI	Adet	1
6	TARAYICI	Adet	13
7	ÇOK FONKSİYONLU YAZICI	Adet	7
8	PROJEKSİYON	Adet	24
9	APPLE IMAC I5 BİLGİSAYAR	Adet	1

Üniversitemiz internet hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan Network Malzemesinin temini için yapılan çalışma neticesinde ödenek durumumuzda dikkate alınarak 75.521,21 TL tutarında aşağıdaki listede yer alan malzemelerin alımı DMO üzerinden gerçekleştirilmiştir. Anılan Network malzemesi ile Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi binası ve Balıca Kampüsünde yenileme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Tablo 9. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi İle Yapılan Network Alımları

S.No	Ürün Adı	Birim	Miktar
1	Switch (Kenar Anahtarlama) 24 Portlu	Adet	13
2	Switch Poe (Kenar Anahtarlama) 24 Portlu	Adet	2
3	Switch Poe (Kenar Anahtarlama) 48 Portlu	Adet	1
4	Switch Modul	Adet	2

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı)						
Proje No: 2017H030380						
Yılı	Proje Ödenęi (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2017	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	134.913,46	99,94

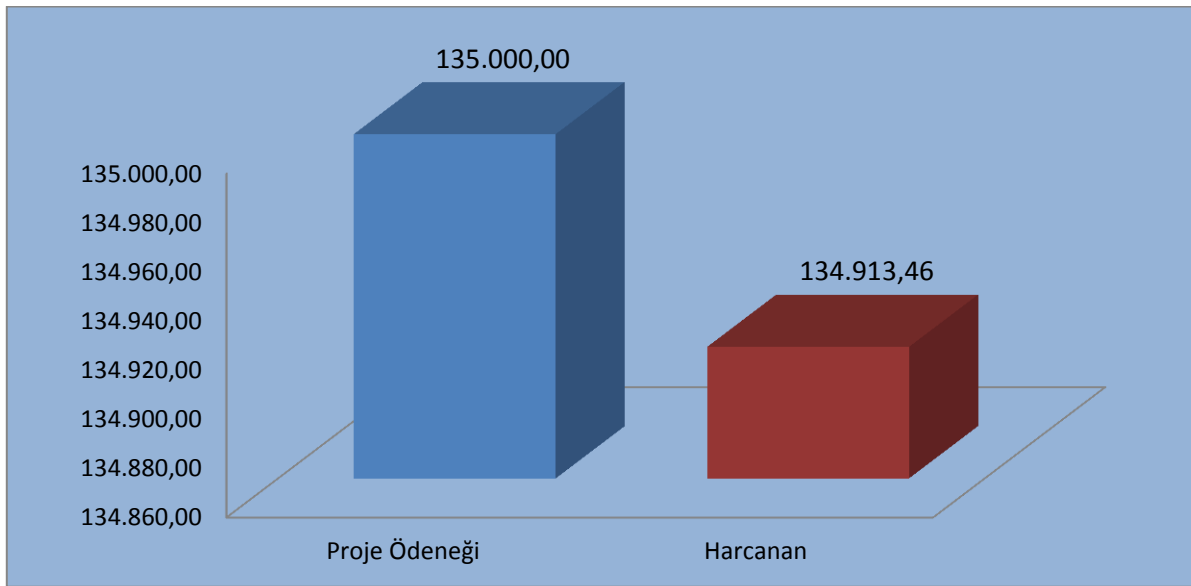

Şekil 10. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım) Projesi (Proje No: 2017H030380) Gerçekleşme Grafięi


2017 yılında 2017H030380 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile yazılım alımları için Üniversitemize ayrılan 135.000,00 TL tutarındaki ödenekten 134.913,46 TL'si kullanılarak % 99,94 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje kapsamında;

- ❖ Elektronik Belge Yönetim Sistemi V4 versiyonundan V5 versiyonuna geçilmesi amacıyla yeni alım sözleşmesi yapılarak 68.440,00 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemizde göreve başlayan personelimiz için Nitelikli Elektronik Sertifika, Kart Okuyucu ve Zaman Damgası temin edilerek toplamda 14.780,10 TL harcanmıştır.
- ❖ Hukuk Müşavirliği biriminde kullanılmak üzere “Mevzuat İhtihat Programı” temin edilerek 1.652,00 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz birimlerinde kullanılan SMS otomasyonu için 1.000.000 (Bir Milyon) adet SMS temin edilerek 7.500,00 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz bilgisayar ve ağ güvenliğinin korunması amacıyla temin edilen ESET Endpoint Protec Antivirus Programı için 21.830,00 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz sunucu sitelerinde 5651 Sayılı Yasaya uygun Logların tutulması amacıyla Sentilog yazılımı için 12.980,00 TL harcanmıştır.
- ❖ Üniversitemiz sunucu sistemlerinde yer alan Windows işletim sistemlerinin güncel olmaması ve destek sürelerinin kısa süre sonra sona ereceğinden, on adet Windows Data Center 2016 lisansı satın alınarak 7.731,36 TL harcanmıştır.

3.5. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi						
Proje No: 2017K120072						
Yıl	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2017	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.400.000,00	93.33

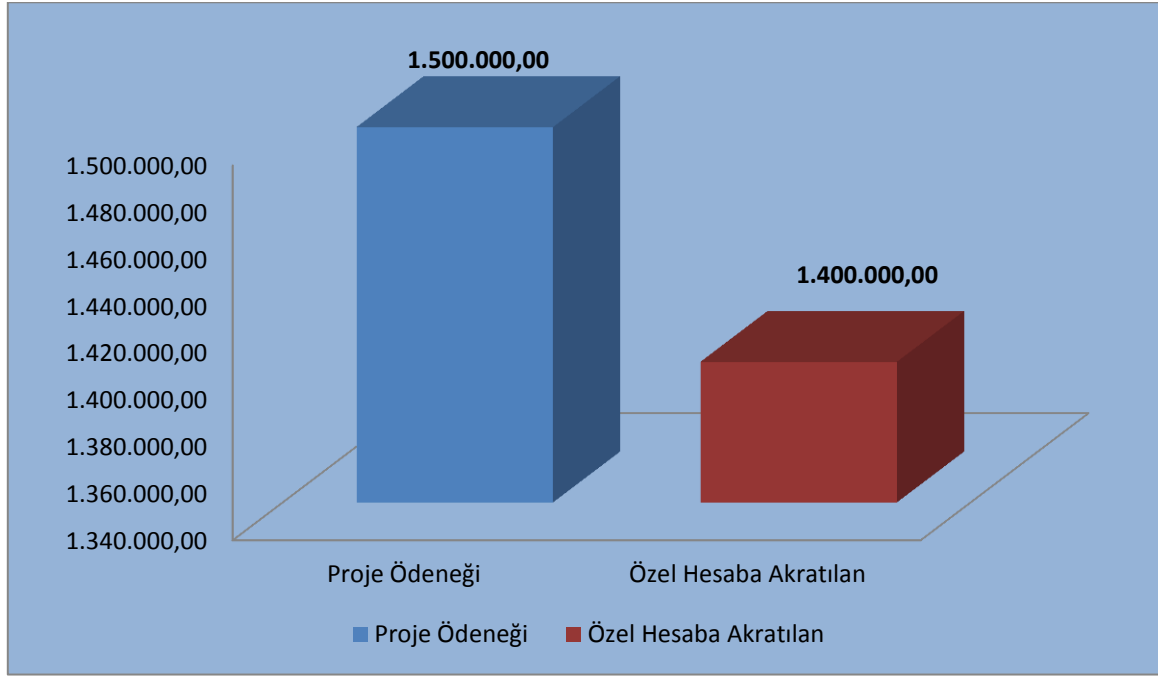

Şekil 11. Merkezi Arşt. Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi (Proje No: 2017K120072) Gerçekleşme Grafiđi

2017 yılında 2017K120072 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi ile Üniversitemize ayrılan 1.500.000,00 TL tutarındaki ödenekten 1.400.000,00 TL'si özel hesaba aktarılarak % 93,33 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

4. ÖNERİLER

Kamu yatırımlarını üstlenecek gerçek ya da tüzel kişilerin belirli bir kurumsal güce (ekonomik, teknik vb. kriterler bakımından) ulaşmıca kadar kamu ihalelerine girmelerini engelleyecek tedbirler belirlenip uygulanmalıdır.

İmalat sektörü sıkı denetim altına alınarak kalitesiz ürünün piyasaya arzı engellenmelidir ya da aynı standart ve teknik özellik adı altında piyasaya arz edilmiş olan ürünler kendi içinde sınıflandırılmalı ve ihtiyaca göre sınıf ya da kalitenin talep edilmesi sağlanmalıdır. Bunun mümkün olamadığı durumlarda kamu idarelerine suiistimallerin önüne geçecek düzenlemeler yapılarak ürünlere ait marka isteme yetkisi verilmelidir.

Yeni ve teknolojik malzemeler binalarda kullanılmak istendiğinde kamu birim fiyatları yeni malzemelere hızlı şekilde güncellenemediđi için özel poz oluşturma olayına gidilmekte bu da maliyetleri artırmaktadır. Bunu düzenleyici alternatiflerin oluşturulması uygun olacaktır.

5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU

Kurum Adı : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE

2017 Yılı Fiyatlarıyla, BİN (TL)

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2016 Sonu Kümülatif Harcama			2017 Yılı Program Ödenek			2017 Yılı Revize Ödenek			2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		227.000		126.224	126.224		27.000	27.000		39.907	39.907		6.116	6.116
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		3.000					1.500	1.500		1.500	1.500		1.400	1.400
TOPLAM	7		230.000		126.224	126.224		28.500	28.500		41.407	41.407		7.516	7.516



Çankırı Karatekin Üniversitesi



karatekin.edu.tr



facebook.com/karatekin.edu.tr



twitter.com/karatekinUni



karatekinuniversitesi.tumblr.com



youtube.com/user/KaratekinUniversity



vimeo.com/karatekinuniversite



instagram.com/karatekinuni
