

Çankırı Karatekin Üniversitesi



2022 YILI  
Yatırım Programı  
İzleme ve  
Değerlendirme  
Raporu

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	2
2. GENEL DEĞERLENDİRME .....	4
2.1. Üniversitemizin Misyonu .....	4
2.2. Üniversitemizin Vizyonu .....	4
2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri.....	4
2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	5
2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu .....	5
2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi .....	7
2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı.....	8
2.8. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	8
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	8
2.8.2.Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları .....	9
3. 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI .....	10
3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.....	10
3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı.....	16
3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.....	17
3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı .....	18
3.5. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.....	22
4. ÖNERİLER .....	22
5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU.....	24



## 1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen **Çankırı Karatekin Üniversitesi**; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi, bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

Üniversitemiz, bu amacına ulaşmak için en son teknolojik makine ve teçhizatlar ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek ve hedeflenen amaca ulaşan araştırmalar yapmak üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaktadır.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde; eğitim ve öğretim, sağlık, araştırma, sportif ve sosyal faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesi amacıyla 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında 6'sı Eğitim ve 1'i DKH-Sosyal ve Teknolojik Araştırma sektöründe olmak üzere 7 adet yatırım projesi yürütülmüştür. Bu yatırım projeleriyle Üniversitemizin fiziki, teknolojik ve araştırma altyapısının

## 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

---

geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda derslik, laboratuvar, altyapı, gayrimenkul, makine-teçhizat gibi çeşitli alanlara yönelik satın alma, bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Kütüphane koleksiyonunun genişletilmesine yönelik basılı ve elektronik yayın alımı yapılmış ve telifine sahip olduğumuz ve aynı zamanda satın aldığımız yazılımların güncellenmesi yapılmıştır.

Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 25' inci ve 60' ıncı maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24' üncü maddesi uyarınca, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz **2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu** ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

**Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ**  
**Rektör**

## 2. GENEL DEĞERLENDİRME

### 2.1. Üniversitemizin Misyonu

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

### 2.2. Üniversitemizin Vizyonu

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediği bir kurum olmaktadır.

### 2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.

#### **AMAÇ 1: Öğrenci Merkezli ve Kalite Odaklı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti Sunmak**

**HEDEF 1:** Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek.

**HEDEF 2:** Eğitim ve öğretimde nitelik ve çeşitliliğin artmasını sağlamak üzere dijital dönüşüm ve entegrasyon çalışmalarını desteklemek.

**HEDEF 3:** Öğrencilere yönelik uluslararasılaşma imkânlarını arttırmak.

**HEDEF 4:** Sosyal aktivite imkânlarının sayısını arttırmak.

**HEDEF 5:** Üniversite öğrencilerinin girişimcilik kabiliyetlerini arttırmak.

#### **AMAÇ 2: Nitelikli Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Sunmak**

**HEDEF 1:** Araştırmada fiziki ve teknik altyapıyı geliştirmek ve araştırmacı hareketliliğini arttırmak.

**HEDEF 2:** Dijital yerliler ve dijital göçmenler arasındaki farkı kapatacak altyapıları geliştirmek.

**HEDEF 3:** ÇAKÜ adresli yayın sayısını arttırmak.

**HEDEF 4:** Bilimsel araştırma projelerinin sayısını arttırmak.

**HEDEF 5:** Kütüphane imkânlarını iyileştirmek.

**AMAÇ 3: Akademik Faaliyetlerin Toplumsal Katkıya Dönüştürülmesi**

**HEDEF 1:** Üniversitemiz bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinin faaliyetlerini ve sayısını arttırmak.

**HEDEF 2:** Üniversitede üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak.

**HEDEF 3:** Kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlemek.

**HEDEF 4:** Sportif etkinliklerin tür ve sayısını arttırmak.

**HEDEF 5:** Toplum sağlığı yararına etkinlikler düzenlemek.

**AMAÇ 4: Ekonomik ve Sosyal Etki Yaratan Girişimcilik Faaliyeti Sunmak**

**HEDEF 1:** Kamu- Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirilerek bölgesel inovasyon ekosistemini düzenlemek.

**HEDEF 2:** Teknolojik ve sosyal inovasyon girişimlerini desteklemek.

**HEDEF 3:** Üniversite kaynaklı toplam FMH başvuru/ tescil sayısını arttırmak.

**HEDEF 4:** Ekolojik inovasyon farkındalığını arttırıcı faaliyetler yapmak.

**AMAÇ 5: Güvence Sistemi Sürekliliğini Destekleyecek Yönetimsel Faaliyetlerin Sunulması**

**HEDEF 1:** Kurumsal kimlik anlayışını güçlendirmek.

**HEDEF 2:** Hizmet kalitesi ve kalite yönetim sistemi uygulamalarının niteliğini arttırmak.

**HEDEF 3:** Bilişim sistemlerinin (UBIS, EBYS vb.) kalitesini ve kapasitesini arttırmak.

**HEDEF 4:** Yerleşik altyapı olanaklarını ve fiziksel olanakları iyileştirmek.

**HEDEF 5:** Merkezi bütçe içi ve dışı gelirleri arttırmak.

**2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları**

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2022 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir tahminleri;

a) Hazine yardımları : 245.188.000,00 TL

b) Öz gelirler : 5.462.000,00 TL olmak üzere

## 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

toplamda **250.650.000,00 TL**’ dir.

Üniversitemizin 2022 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan eklemelerle bu ödenek 459.970.382,74 TL olmuş, söz konusu ödeneğin 100.150.000,00 TL’si yatırım giderlerinin finansmanı için tahsis edilmiştir. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır.

### 2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik ayrıma göre bütçe gelirleri durumu

2022 YILI GELİR CETVELİ		
GELİR EKONOMİK KOD	PLANLANAN GELİR	GERÇEKLEŞEN
03.1.1.01	21.000,00	50,00
03.1.2.03	6.000,00	1.540,46
03.1.2.10	0,00	80.049,59
03.1.2.29	323.000,00	10.942.291,53
03.1.2.31	1.867.000,00	627.643,95
03.1.2.32	0,00	118.918,84
03.1.2.33	0,00	1.251.706,81
03.1.2.34	65.000,00	10.845.760,90
03.1.2.35	12.000,00	0,00
03.1.2.36	0,00	201.500,00
03.1.2.38	99.000,00	0,00
03.1.2.45	0,00	368.029,75
03.1.2.99	917.000,00	2.437.802,15
03.5.1.01	0,00	2.000.000,00
03.6.1.01	20.000,00	100.123,33
03.6.1.03	55.000,00	0,00
03.6.1.99	25.000,00	196.281,53
<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>3.410.000,00</b>	<b>29.171.698,84</b>
04.2.1.01	205.788.000,00	287.619.000,00
04.2.2.01	39.400.000,00	54.346.500,00
04.5.1.13	0,00	386.600,00
<b>Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	<b>245.188.000,00</b>	<b>342.352.100,00</b>
05.1.9.01	0,00	3.569,39
05.2.6.16	85.000,00	1.151.095,93
05.3.2.99	6.000,00	64.005,07
05.3.9.99	0,00	313.853,47
05.9.1.01	0,00	701.978,68
05.9.1.06	0,00	302.868,71
05.9.1.19	1.961.000,00	4.318.903,70
05.9.1.99	0,00	541.084,89

Ayrıca 32.250.000,00 TL tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları kullanılarak yatırım bütçesinde ödenekleştirilmiş olup projeler arası 2.455.000,00 TL ödenek aktarım işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 28.500.000,00 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneği olarak tahsis edilmiştir.

## 2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Üniversitemizin mevcut hizmet üretim kapasitesi

Üniversitemiz Arsa Oturum Dağılımı (m <sup>2</sup> )					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Uluyazı Yerleşke Alanı	-	2.080.899,42	-	2.080.899,42	Tahsisli
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	784,88	-	784,88	Tahsisli
Balıca Yerleşkesi	-	64.090,00	-	64.090,00	Tahsisli
Orman Fakültesi	-	-	5.260,00	5.260,00	Tahsisli
Sağlık Bilimleri Fakültesi	-	22.878,00	-	22.878,00	Tahsisli
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	-	-	1.817,89	1.817,89	Kira
İlgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu	-	-	4.015,00	4.015,00	Tahsisli
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi (Taş Mescit)	-	23.552,00	-	23.552,00	Tahsisli
Eldivan Sağlık Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	-	-	2.046,00	2.046,00	Tahsisli
ÇAKÜ Sosyal Tesis ve Konukevi	424,00	-	-	424,00	Kamu Kurumlarının Bedelsiz Devri
Kızılırmak MYO	-	3.037,00	-	3.037,00	Tahsisli



## 2.7.Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3. Üniversitemiz binalarının niteliksel dağılımı

Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m <sup>2</sup> )	
Bina Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> )
	Üniversite
Toplam Eğitim Alanları	28.817
Toplam Laboratuvar Alanı	1.498
Toplam Yemekhane-Kantin Alanı	8.633
Toplam Lojman Alanı	4.037
Toplam Spor Alanı	6.633
Toplam Sosyal Tesis ve Yurt Alanı	1.597
Toplam İdari Ofis Alanı	18.645
Toplam Kütüphane Alanı	8.723


## 2.8.2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

### 2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarı olarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. Genel yatırım uygulama durumu

Sektör	2022 Yılı KBÖ (TL)	2022 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi (TL)	Oran (%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	36.300.000,00	43.883.969,52	120,89
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	2.000.000,00	0,00	0,00
DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
<b>Toplam</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>44.983.969,52</b>	<b>114,17</b>

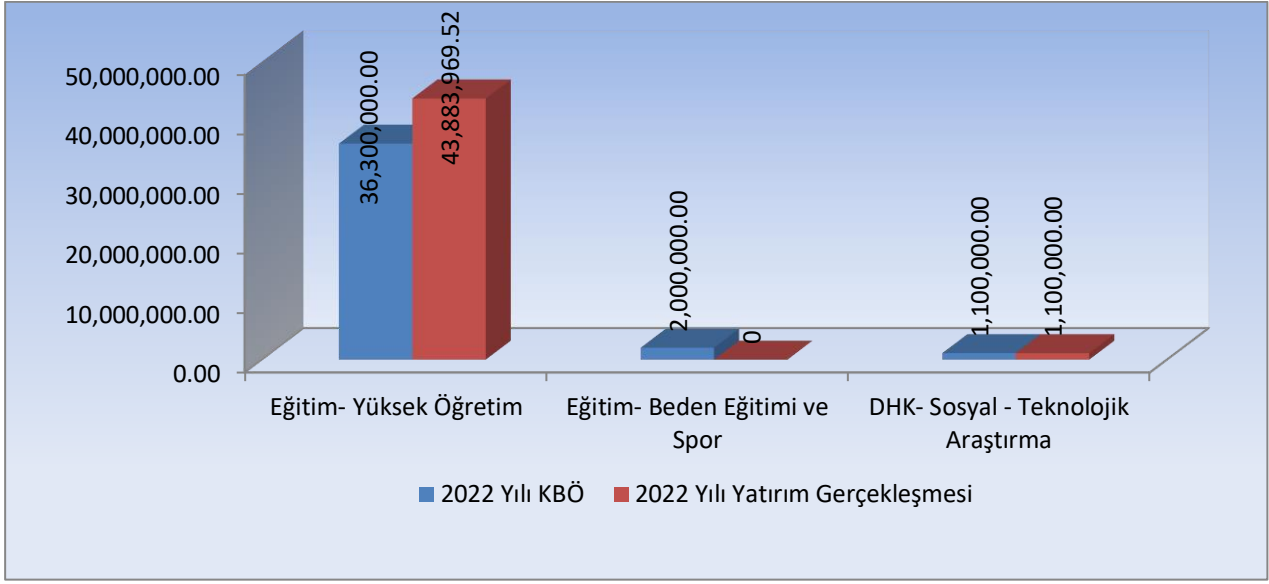

Şekil 1. 2022 Yılı genel yatırım uygulama grafiği

### 2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Tablo 5. Sermaye giderlerinin ekonomik kod ve dağılımları

EKO. KOD	AÇIKLAMA	2022YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2022 YILI EKLENEN ÖDENEK (TL)	2022 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK (TL)	2022YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	5.600.000,00	3.300.000,00	0,00	8.900.000,00	6.581.717,17
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	500.000,00	1.925.000,00	0,00	2.425.000,00	1.291.719,66
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	31.300.000,00	56.720.000,00	4.055.000,00	83.965.000,00	32.627.243,65
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000,00	2.860.000,00	0,00	4.860.000,00	4.483.289,04
	<b>TOPLAM</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>64.805.000,00</b>	<b>4.055.000,00</b>	<b>100.150.000,00</b>	<b>55.127.406,35</b>

## 3.2022YILI PROJE UYGULAMALARI

## 3.1.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi						
Proje No: 2022H03-186374						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2022	300.000,00	420.000,00	0	720.000,00	530.654,00	%73,70

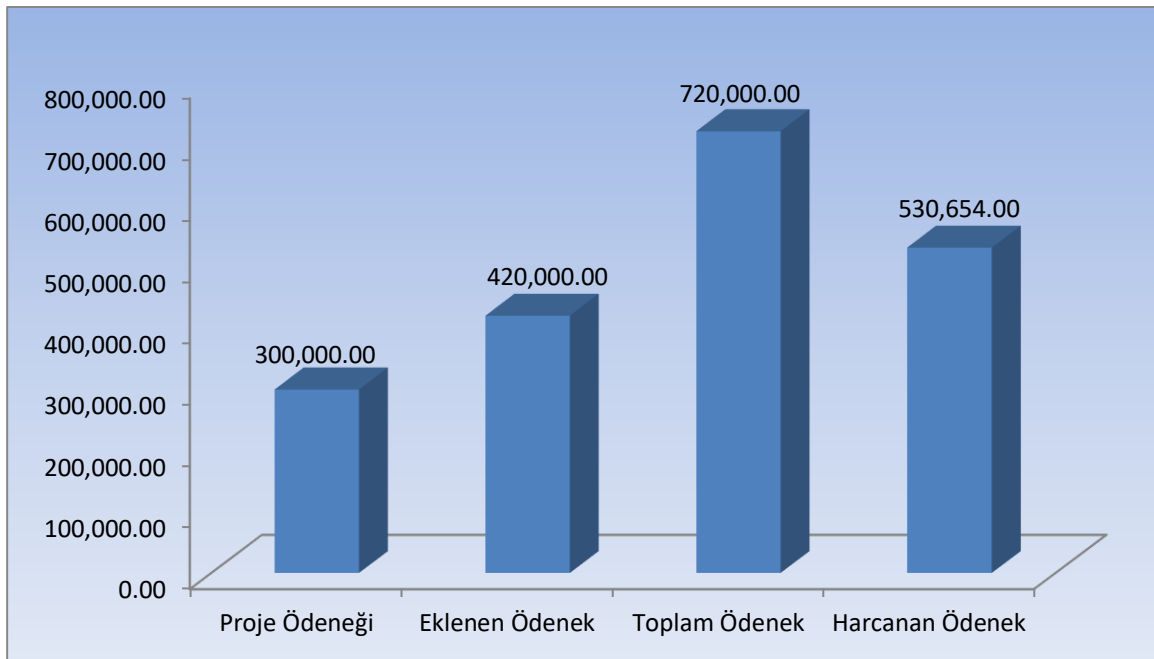


Şekil 2. Çeşitli ünitelerin etüt projesi (Proje No: 2021H03-167854 ) gerçekleşme grafiği

2022 yılında 2022H03-186374 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 300.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 420.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 720.000,00 TL ödeneğin 530.654,00TL' si kullanılarak % 73,70 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında; Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Uygulama Projeleri Hazırlanması İşİ 13.10.2021 tarihinde ihale edilmiştir. Sözleşme tarihi 02.11.2021'dir. İş tamamlanmıştır. Yemekhane Binası Etrafında Obruk Oluşumu Sebebiyle Jeofizik Deneyi Yapılması İşİ tamamlanmıştır. ÇAKÜ Uluyazı Kampüsünde Kapalı Halı Saha ve Hizmet Binası Mimari ve Statik Uygulama Projeleri Hizmet Alım İşİ tamamlanmıştır. Merkezi Derslik revize statik projesi hizmet alımı işİ tamamlanmıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)						
Proje No: 2022H03-186360						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2022	2.000.000,00	2.860.000,00	0	4.860.000,00	4.483.289,04	%92,24

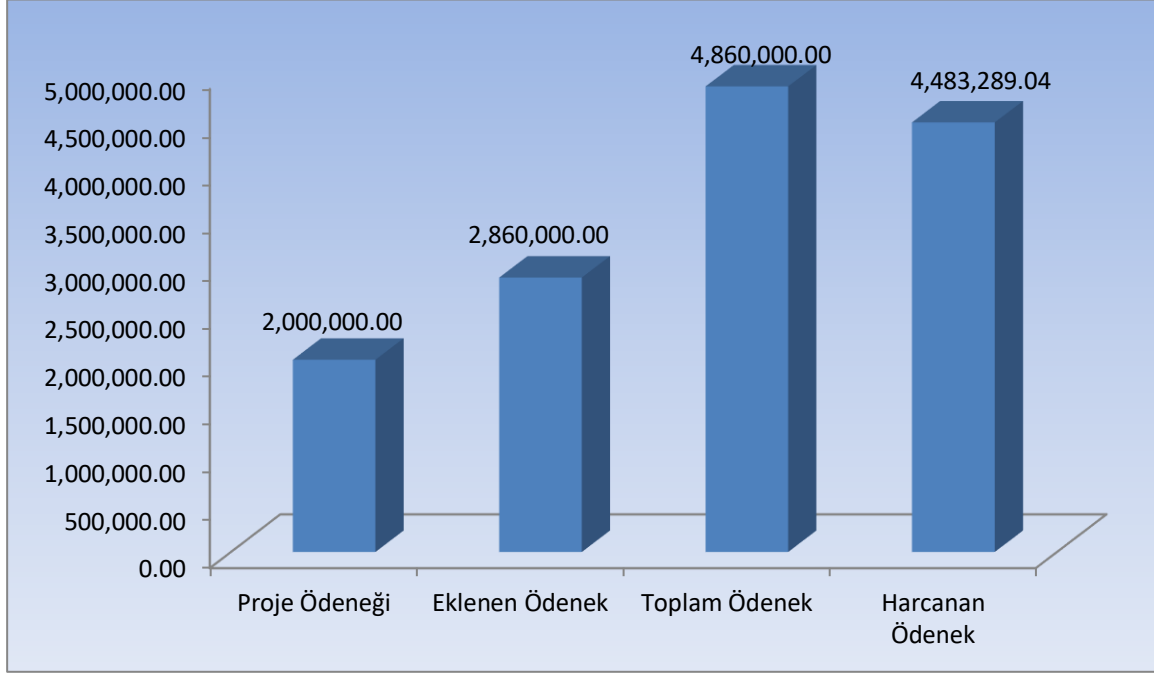

Şekil 3. Muhtelif işler büyük onarım projesi (Proje No: 2021H03-167856) gerçekleşme grafiği)


2022 yılında 2022H03-186360 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 2.000.000,00 TL tutarındaki ödenğe yıl içerisinde 2.860.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 4.860.000,00 TL ödenegin 4.483.289,04TL' si kullanılarak % 92,24 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında; Üniversitemiz Akademik Binalar ve Spor Tesisleri Onarımı İşine ait sözleşme 17.08.2022 tarihinde imzalanmış olup iş yılsonu itibariyle tamamlanmıştır. Geçici kabul işlemleri devam etmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi Bina Tadilatı Yapım İşine ait sözleşme 13.05.2022 tarihinde imzalanmış olup sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 30.07.2022 olup iş tamamlanmıştır. Gerekli olan çeşitli bakım onarım işleri tamamlanmıştır. Ayrıca;

- Bakım onarım çalışmalarında kullanılmak üzere mal ve malzeme alımları yapılmıştır.

- Dış Hekimliği Fakültesi Ek Binası (Merkezi Derslik A Blok) İçerinde Ofis Bölmeleri Yapım İşi tamamlanmıştır.
- İslami İlimler Fak. Binası Merdivenlerine Güvenlik Filesini Yapım İşi tamamlanmıştır.
- Rektörlük binası makam katındaki odalarda bulunan parkelerin silme, cilalama, vernikleme, bakım ve onarım işi,
- Rektörlük Binası Çatı Onarım İşini,
- Kütüphane binası Pencere Bölümlemesi ve cam değişimi işi,
- Güzel Sanatlar Fakülte Binası Çatı Onarım İşini,
- Hukuk Fakültesi 3. kat çay ocağına mutfak dolabı yapılması işi,
- Sağlık Bilimleri Fakültesindeki yağmur oluk iniş borularının değişimi, kanalizasyon tamirati ve logar yapılması,
- Balıca Eğitim Binasındaki dış cephe sıvalarının düşmesini engellemek amaçlı tel örgü montajı işi,
- Uluyazı Kampüsü Kapalı Spor Salonu Çatı Tadilat İşini,
- Rektörlük Binası Makam Odaları Kapılarının İç ve Dış Deri Kaplama Yapılması İşini,
- Balıca Kampüsü Muhtelif Yerlerde Kanalizasyon Baca Temizliği ve Hat Değişimi Yapılması İşini,
- Otomatik fotoselli kapı bakım ve onarım işi,
- Rektörlük Binası Cephesi İçin Cephe Kaplama Tuğlası Alımı İşini,
- Üniversitemiz kampüs içerisindeki reklam panolarının sökülerek yürüyüş yoluna taşınması ve montajının yapılması işi,
- Üniversitemizde bulunan 11 adet Telefon santrallerinin 2022 yılı bakım işi tamamlanmıştır.
- Üniversite binalarımızda bulunan Yangın Alarm Sistemlerinin 2022 yılındaki bakımları tamamlanmıştır.
- Asansör bandrol değişikliği için bakım onarım işlemleri yapılmıştır.
- 11 adet Trafo, trafo hücresi ve 5 adet binanın kompanzasyonlarının 2022 yılı sonuna kadar 3 defa bakımının yapılması işine ait ödeme tamamlanmıştır.
- 5 adet sabit jeneratörlerin 2022 yılı sonuna kadar toplamda 3 defa periyodik bakımının yapılması işine ait ödeme tamamlanmıştır.
- Balıca kampüsü A Blok kanalizasyon gideri onarım işi tamamlanmıştır.

Proje Adı: Kampüs Altyapısı						
Proje No: 2020H03-150410						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oran (%)
		Eklenen	Düşülen			
2022	4.000.000,00	7.000.000,00	2.455.000,00	8.545.000,00	7.212.743,29	% 84,40

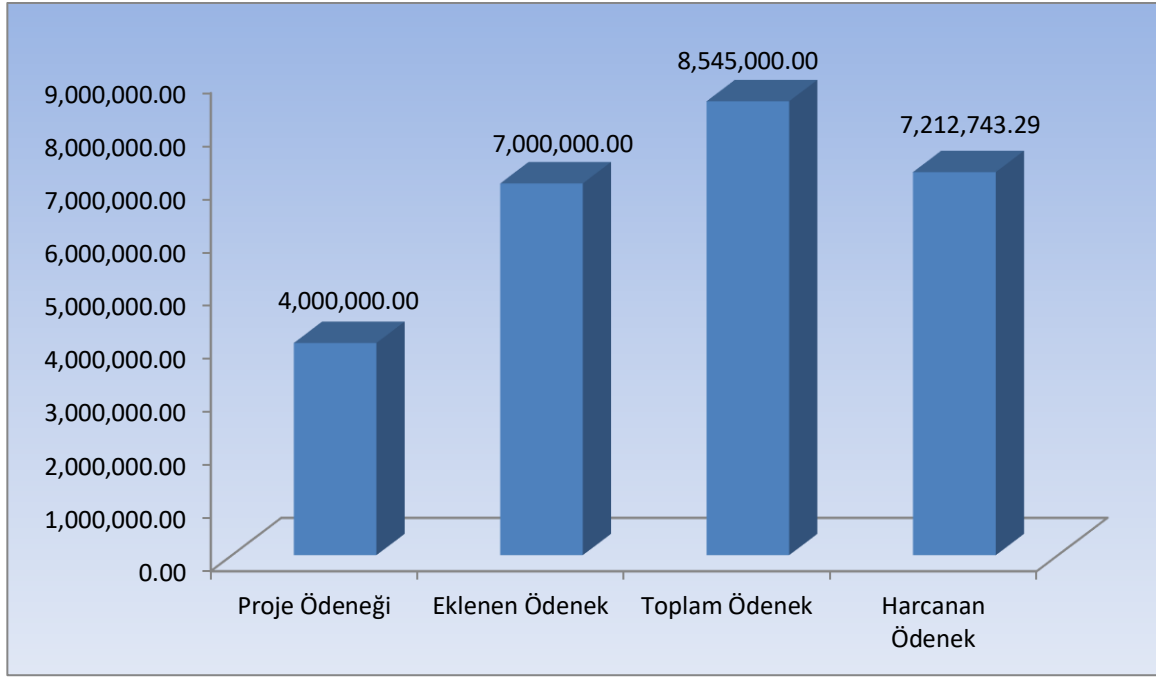


Şekil 4. Kampüs altyapısı projesi (Proje no:2020h03-150410) gerçekleştirme grafiği

2021 yılında Uluyazı kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2020H03-150410 nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 4.000.000,00 TL tutarındaki ödeneye yıl içerisinde 7.000.000,00 TL ödenek eklenmiş ve 2.455.000,00 TL ödenek düşülmüş olup, toplam 8.545.000,00 TL ödenenin 7.212.743,29 TL' si kullanılarak % 84,40 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında ÇAKÜ Uluyazı Kampüsü Çevre Düzenleme İşinin sözleşmesi 19.10.2022 tarihinde imzalanmıştır. İşin bitiş tarihi 22.12.2022 olup geçici kabul işlemleri devam etmektedir. ÇAKÜ İstinat Duvarı Tamiri ve Çevre Düzenleme Yapı İşine ait sözleşme 27.09.2022 tarihinde yapılmıştır. İş tamamlanmış olup geçici kabul işlemleri devam etmektedir.

Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler						
Proje No: 2009H03-1043						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2022	25.000.000,00	43.700.000,00	0,00	68.700.000,00	24.883.846,32	%36,22

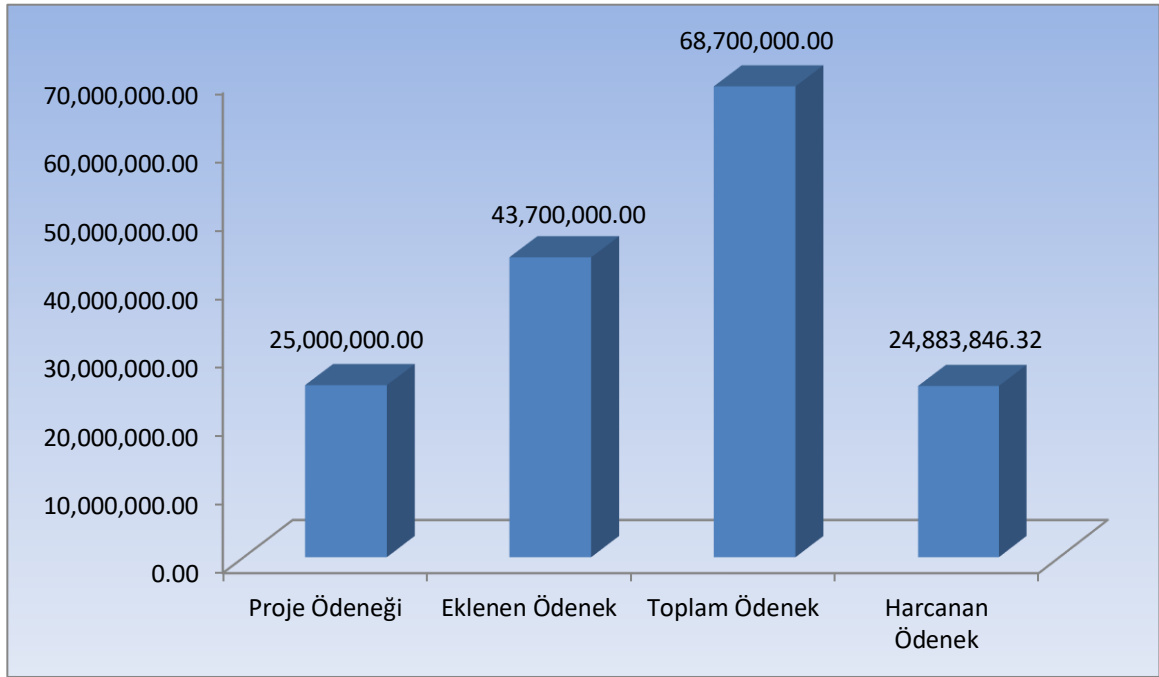

Şekil 5. Derslik ve merkezi birimler projesi (Proje no:2009h03-1043) gerçekleşme grafiği

2022 yılında 2009H03-1043 nolu derslik ve merkezi birimler projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 25.000.000,00TL tutarındaki ödeneye yıl içinde 3.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplam 68.700.000,00 TL ödenenin 24.883.846,32 TL' si yıl içerisinde kullanılarak % 36,22 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında;


Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 03.08.2021 tarihinde ihale edilmiştir. 02.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 31.03.2026'dır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi 2500 m<sup>2</sup> Merkezi Derslik Projesi kapsamında Merkezi Derslik C Blok Yapım İşine ait sözleşme 08.06.2022 tarihinde imzalanmış olup sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 09.08.2023'tür.

## Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No:2019H05-187973

Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2022	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0	0

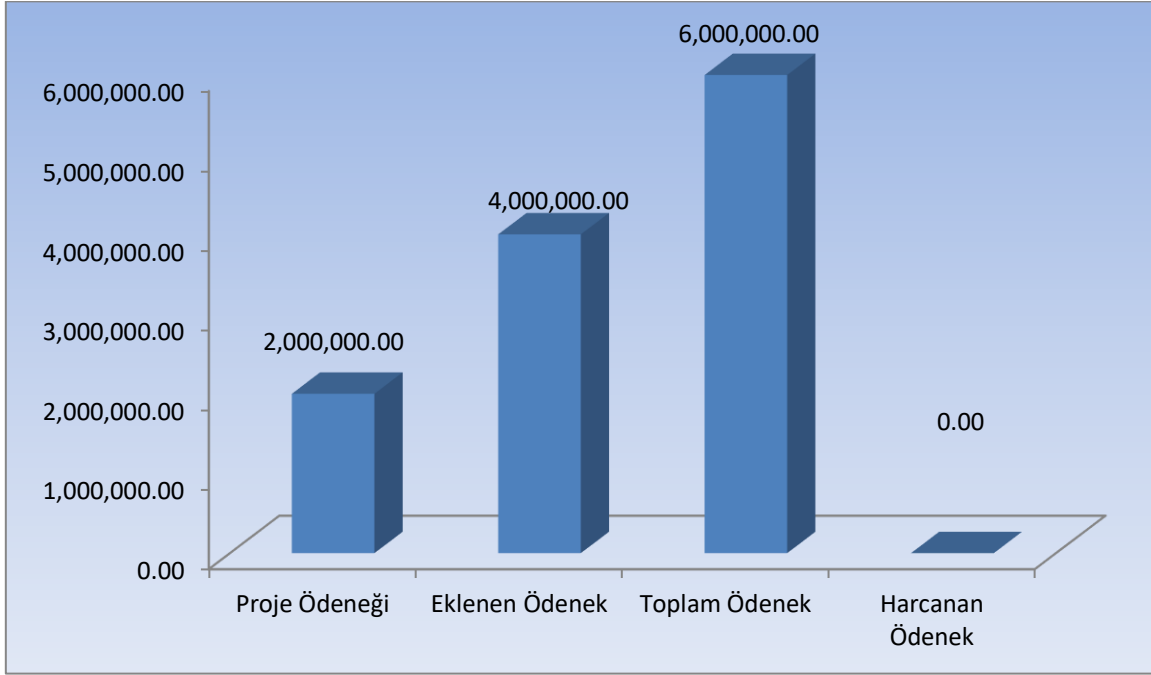

Şekil 6. Açık ve kapalı spor tesisleri projesi (Proje no:2019h05-187973) gerçekleşme grafiği


Projenin 2022 yılı ödeneği 2.000.000,00 TL olup, eklenen ödenek 4.000.000,00 TL'dir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinin içerisinde yer alan Kapalı Halı Saha (1 adet) ve Tırmanma Duvarı (1 adet) projesine ait yapım işi ihalesi yaklaşık maliyetin çok üzerinde teklifler verildiği için iptal edildiğinden projede bir gerçekleşme olmamıştır.

Uygulama Projeleri hazır olduğu için 2023 yılında gerekli revizyonlar yapılarak yeniden ihale edilecektir.



## 3.2.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı)						
Proje No: 2022H03-186360						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2022	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.996.506,08	% 66,55

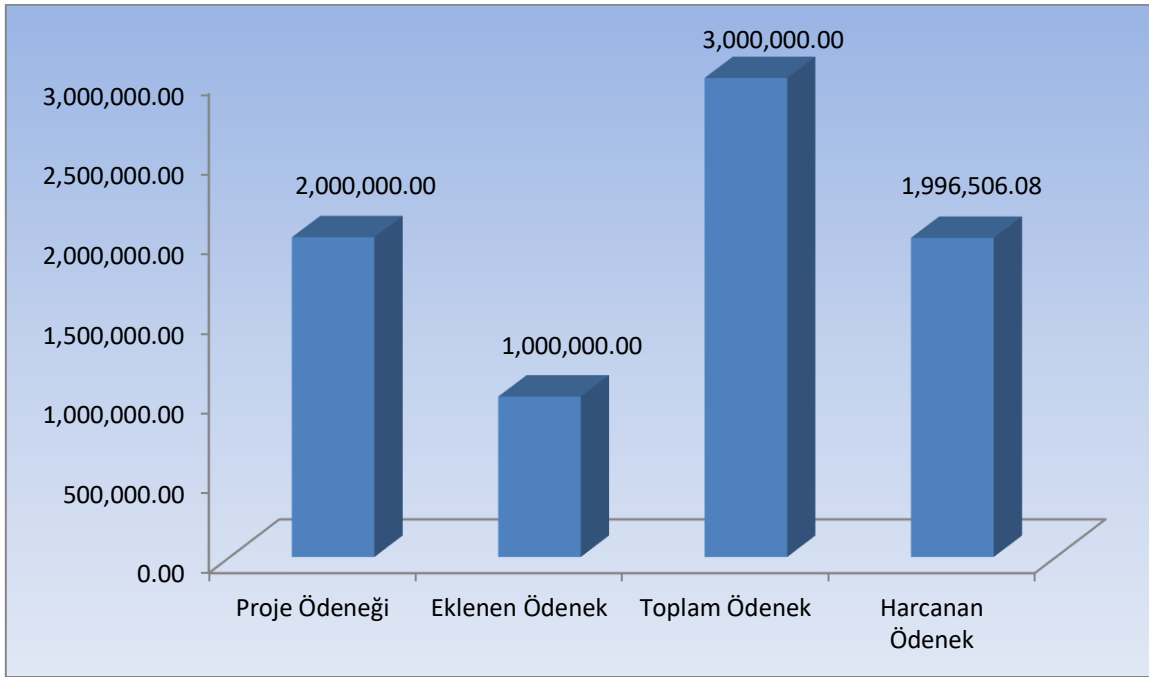

Şekil 7. Muhtelif işler projesi (Proje no: 2022h03-186360) gerçekleşme grafiği

2022 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Muhtelif İşler Projesi ile Üniversitemize ayrılan 2.000.000,00 TL ödenekten yıl içerisinde 1.000.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 3.000.000,00 TL ödeneğin 1.996.506,08 TL' si kullanılarak % 66,55 gerçekleşme sağlanmıştır.

Proje kapsamında aşağıdaki harcamalar gerçekleştirilmiştir:

Tablo 6. Muhtelif işler (makine-teçhizat ve kara taşıtı alımı) projesi kapsamında yapılan alımlar


DMO Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı	Harcama Tutarı (TL)
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu- Laboratuvar Tezgahı Alımı	149.270,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi- Çalışma Koltuğu Alımı	56.712,64
Diş Hekimliği Fakültesi- Çalışma Masası, Malzeme Taşıma Arabası, Laboratuvar Tezgahı, Evye, Malzeme Dolabı, Ayna Alımı	151.272,00
Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Çerçes Meslek Yüksek Okulu, Şabanözü Yerleşkesi- Yemek Masası, Tebeşirli Yazı Tahtası, Sandalye, Yemek Masası, Sandalye Alımı	322.999,16

## 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Dış Hekimliği Fakültesi- Nokta Vuruşlu Yazıcı, Elektrokoter Cihazı, Periapikal Dış Röntgen Cihazı, Ağız içi Fosfor Plak Tarayıcı, Dış Üniteli, Nokta Vuruşlu Yazıcı, Barkod- Etiket Yazıcı, Duvar Tipi Split Klima Alımı	420.476,91
Dış Hekimliği Fakültesi- Dental Kompresör, Aspiratör Cihazı, Masaüstü Buhar Sterilizatörü Alımı	625.683,96
<b>Doğrudan Temin Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı</b>	
<b>Harcama Tutarı (TL)</b>	
Genel Sekreterlik- Mobilya Alımı	14.350,01 TL
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – 18AU 256 Plakalı Araç Bakım Onarım	33.040,00 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi- Otomatik External, Defibrilatör Alımı	8.024,00 TL
Genel Sekreterlik- Dilsiz Uşak Alımı	1.392,40 TL
Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Şabanözü Yerleşkesi- Yemekhane Malzemesi Alımı	79.768,00 TL
Çerkeş Meslek Yüksek Okulu - Yemekhane Malzemesi Alımı	73.750,00 TL
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü/ Araç Amirliği- Araç Lastiği Alımı	31.222,80 TL
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/ Kamera İzleme ve Kontrol Birimi- Ağ Test Cihazı Alımı, Şarjlı Matkap Alımı, VGA HDI KVM Extender	28.544,20 TL

### 3.3.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Adı: Yayın Alımı						
Proje No: 2022H03-186366						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
<b>2022</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	987.813,51	%98,78

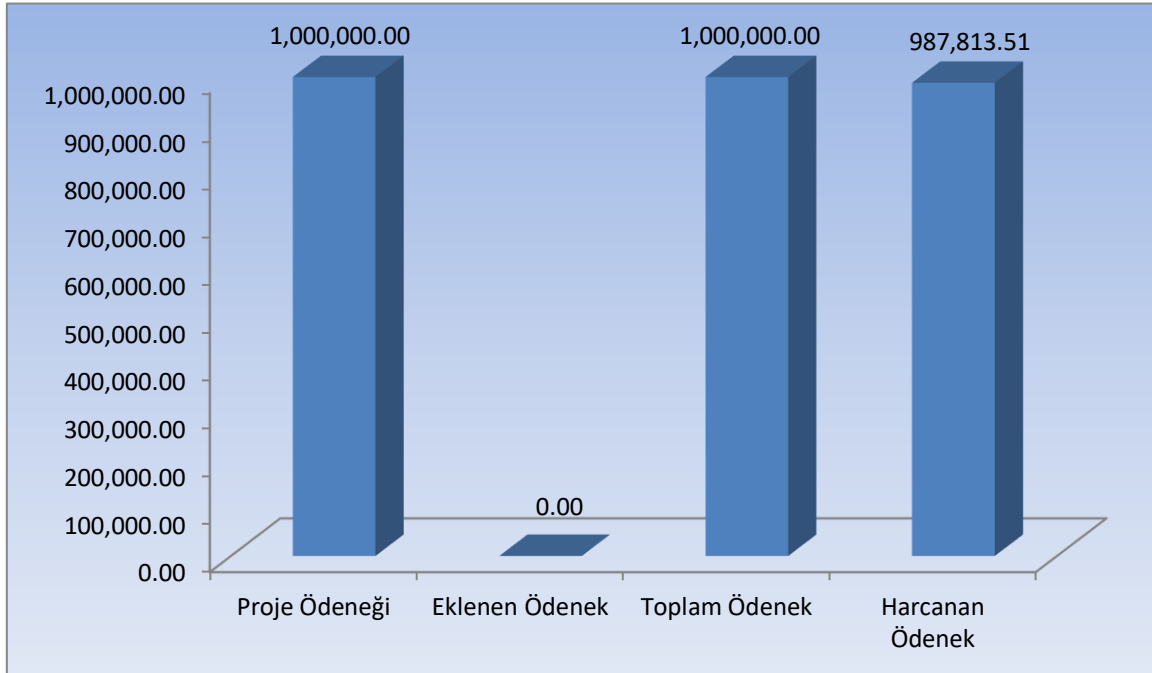

Şekil 8. Yayın alımı projesi (Proje no: 2022h03-186366) gerçekleştirme grafiği

## 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2022 yılında 2022H03-186366 nolu Yayın Alımı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 1.000.000,00 TL tutarındaki ödeneğin 987.813,51 TL'si yayın alımı giderlerinde kullanılarak % 84,80 gerçekleşme sağlanmıştır.

Projesi kapsamında 122.947,27 TL tutarı ile mevcut elektronik yayın abonelikleri; 196.272,41 TL kısmı ile yeni e-kaynak aboneliği gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz akademik birimlerinin talebi olan 527.478,24 TL tutarında 764 adet E-Kitap satın alınmıştır. 3 kalemde 127.151,00 tutarında 849 adet basılı kitap satın alınmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki listede belirtilen elektronik veri tabanlarının abonelikleri gerçekleştirilerek bedeli ödenmiştir.

Abone olunan tam metin veri tabanları ve elektronik ortamda sağlanan ürünler,


- *SOBİAD* Sosyal Bilimler Atıf İndeksi
- *HiperKitap* Türkçe Tam Metin Kitap platformu
- *Yordam VETİS* Elektrronik kaynaklara Uzaktan erişim sistemi
- *İdealonline* Tam Metin Türkçe Dergi Platformu
- *Legal Online Hukuk Dergi ve Kitapları platformu*
- *Turcademy Kitap Koleksiyonu*
- *LC ClassWeb Aracı*

### Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

2022 yılı içerisindeki kur ataklarından kaynaklı döviz artışı Türk Lirası bazında basılı ve elektronik yayınların fiyatlarını etkilediğinden koleksiyon gelişimini sekteye uğratmıştır.

### 3.4.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Donanım Alımı)						
Proje No:2022H03-186360						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2022	1.500.000,00	2.300.000,00	0,00	3.800.000,00	2.497.397,58	%65,72

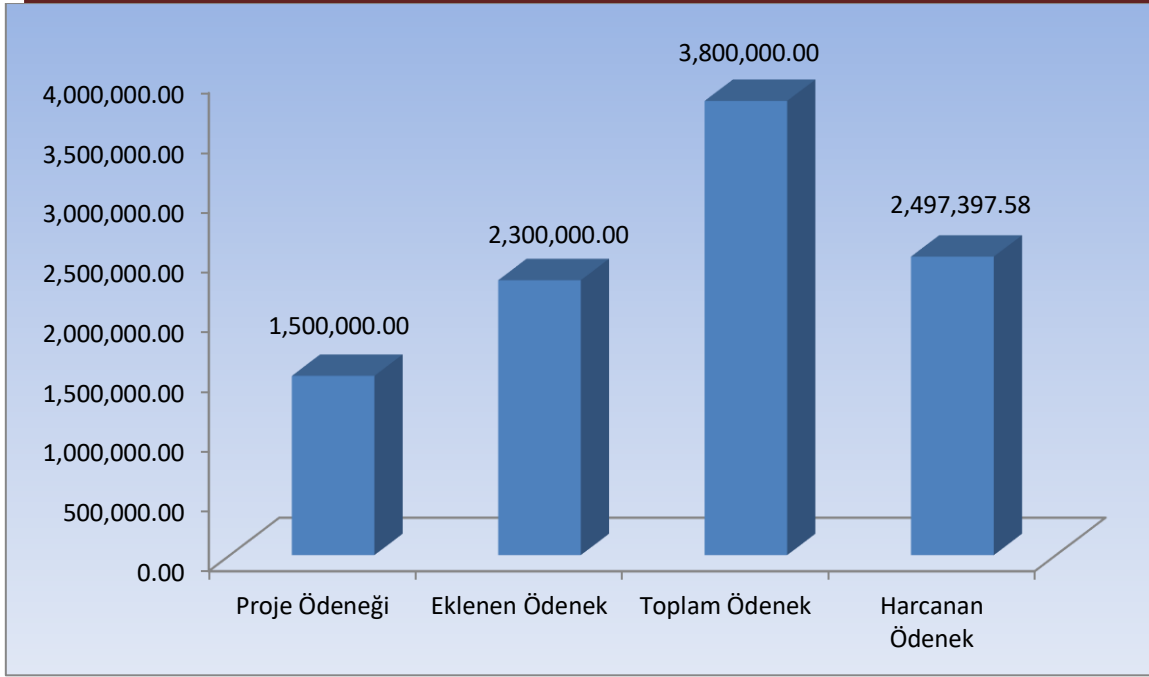

Şekil 9. Muhtelif işler (bilgi teknolojileri-donanım) projesi (Proje no: 2022h03-186360) gerçekleştirme grafiği

2022 yılında 2022H03-186360 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile donanım alımları için Üniversitemize ayrılan 1.500.000,00 TL ödeneye yıl içerisinde 2.300.000,00 TL eklenmiş olup, toplam 3.800.000,00 TL ödenenin 2.497.397,58 TL'si kullanılmış olup % 65,72 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.


#### Proje kapsamında:

- Üniversitemizin bünyesinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 189.698,16 TL harcama yapılarak erişim cihazı alımı yapılmıştır.
- Üniversitemiz tüm birimlerinde kullanılmak üzere 68.746,80 TL tutarında IP Telefon ve Power Kasa alımı yapılmıştır.
- Üniversitemizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 72.210,10 TL tutarındaki malzeme talepleri 2022 bütçe kaynakları doğrultusunda, HP 12GB SS, mikrofon, Pcs Ppatch Panel, kablosuz görüntü aktarıcı, adaptör, amfi doğrudan temin usulü ile satın alınmıştır.
- Üniversitemiz akademik birimlerinin, idari birimlerin ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere doğrudan temin usulü ile 48.184,12 TL ye konferans ses sistemi satın alınmıştır.
- Birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan bilişim malzeme talepleri üzerine, ödeneğimiz ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak, 61.236,10 TL tutarında muhtelif sarf malzemeleri doğrudan temin usulü ile satın alınmıştır.

## 2022 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinin eksik malzemelerini tamamlamak amacıyla 2022 bütçemiz kaynakları doğrultusunda doğrudan temin usulü ile 85.432,00 TL ye gerekli malzemelerin satın alımı gerçekleştirilmiştir.
- Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan temin usulü ile 85.342,32 TL'ye anakart, işlemci AMD, RAM 8GB, güç kaynağı satın alınmıştır.
- Üniversitemiz akademik birimlerinin, idari birimlerin ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere Doğrudan temin usulü ile 55.849,40 TL' ye projeksiyon lambası, ethernet kartı, laptop adaptörü, Usb To Ethernet, depolama ünitesi diski, Ssd disk satın alınmıştır.
- Üniversitemizde kullanılan bilgisayar ağına içerden ve dışarıdan erişebilen kaynakların yetkisiz erişimi engellemek amacıyla 1.103.300,00 TL harcama yaparak DMO üzerinden Ağ Güvenlik Sistemi temin edilmiştir.
- Üniversitemizin Akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere DMO üzerinden 231.562,57 TL harcama yapılarak bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri temin edilmiştir.
- 2021 Yılı Bütçesinden DMO üzerinden alımı başlatılıp ancak yılsonuna teslimatı yetişemeyen bilişim malzemelerinin 495.836,00 TL ödemesi 2022 bütçesinden kişi borcu olarak yapılmıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım Alımı)						
Proje No:2022H03-1868360						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2022	500.000,00	1.925.000,00	0	2.425.000,00	1.291.791,66	%53,26

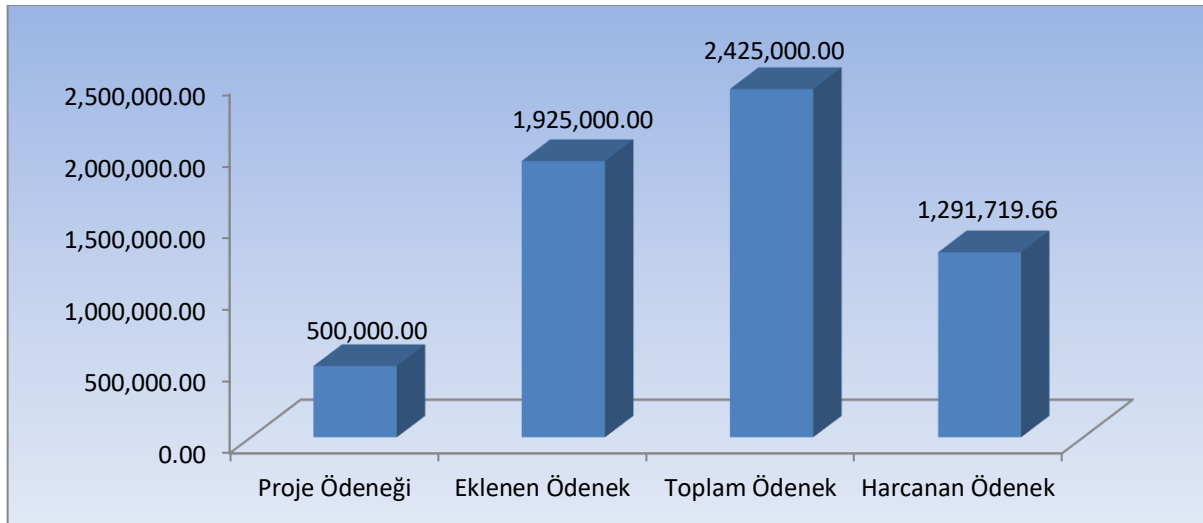

Şekil 10. Muhtelif işler (bilgi teknolojileri-yazılım) projesi (Proje no: 2022h03-186360) gerçekleşme grafiği


2022 yılında 2021H03-186360 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile yazılım alımları için Üniversitemize ayrılan 500.000,00 TL ödeneğe yıl içerisinde 1.925.000,00 TL eklenmiş olup, toplam 2.425.000,00 TL ödeneğin 1.291.719,66 TL'si kullanılmış olup % 53,26 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje kapsamında;

- Üniversitemizde kullanılan BAP Otomasyonunun yıllık lisans süresinin dolması nedeniyle ve teknik destek hizmetinin devamını sağlamak için (3(üç) yıllık) 60.000,00 TL harcanarak güncelleme yapılmıştır.
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi V5 versiyonu için güncelleme ve bakım sözleşmesi yapılarak 43.919,60 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizin uzaktan eğitim altyapısında kullanılmak üzere DMO portalı üzerinden Eğitim Yönetim Sistemi (PERCULUS Eğitim yazılım Paketi) almak için 294.705,00 TL harcanmıştır.
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca kullanılmakta olan Hakediş Bilgisayar paket programının Lisans süresi dolduğundan 35.000,00 TL'ye söz konusu program satın alınmıştır.
- Üniversitemiz öğrencilerinin lisanslarının güncellenmesi ve takip edilebilmesi için DMO' e- satış portalı aracılığıyla 414.180,00 TL harcanarak Microsoft Kampüs lisansı temin edilmiştir.
- Üniversitemizde göreve başlayan idari ve akademik personeller için Nitelikli Elektronik Sertifika, Kart Okuyucu ve Zaman Damgası temin edilerek toplamda 215.857,40 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizde Uzaktan eğitimin sağlanabilmesi için Konferans Sistemimi (ZOOM) temin edilmiş ve bunun için 35.683,20 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizin Yapraklı Meslek Yüksekokulunun ihtiyacına binaen 4.130,00 TL harcanarak Genel Sınav Değerlendirme Programı satın alınmıştır.
- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Grafik Tasarım Yazılım ADOBE (3 Yıllık) Programı alınarak 52.223,46 TL harcama yapılmıştır.
- Üniversitemizin İdari Mali İşleri Daire Başkanlığının ihtiyacına binaen İnsan Kaynakları Yönetim Yazılımı alınarak 49.531,11 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizin sunucuları için Abaküs 360 Log destek paketi alınarak 85.550,00 TL harcanmıştır.
- Üniversitemizde kullanılan bilgisayar programlarının güvenliğini sağlamak amacıyla 939,89 TL harcanarak SSL Güvenlik Sertifikası satın alınmıştır.

## 3.5.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi						
Proje No: 2017K120072						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2022	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	% 100,00

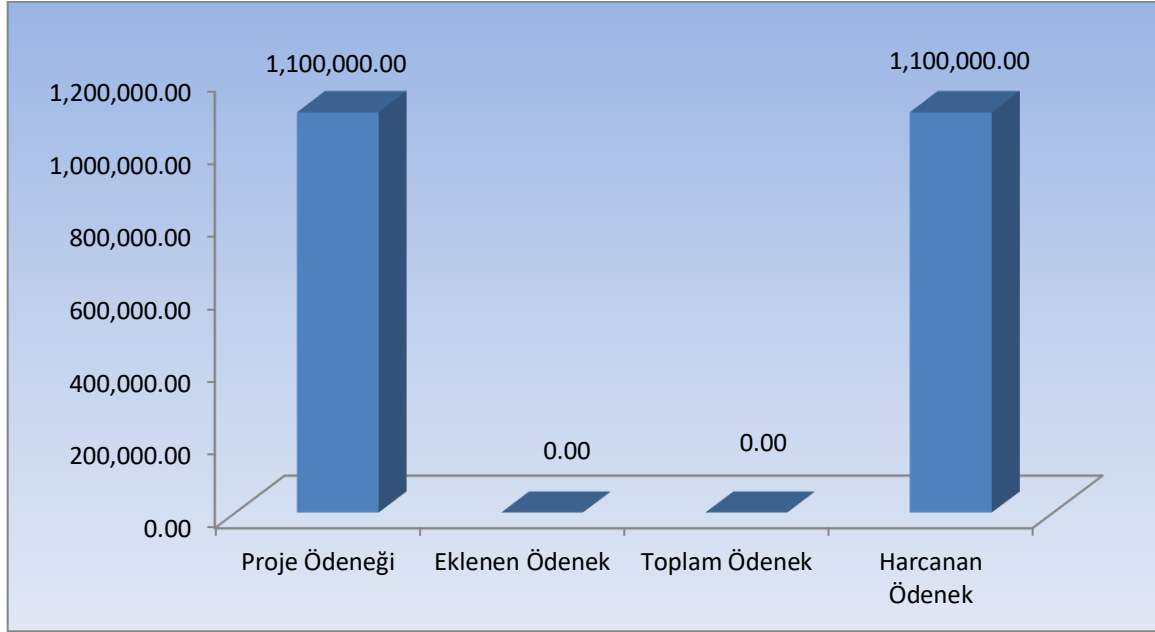

Şekil 11. Merkezi arşt. laboratuvarına ilave altyapı projesi (Proje no: 2017k12-3850) gerçekleşme grafiği

2022 yılında 2017K120072 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi ile Üniversitemize ayrılan 1.100.000 TL ödeneğin tamamı kullanılmış olup %100,00 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

## 4.ÖNERİLER

- 1) Piyasalardaki değişim sebebi ile ortaya çıkan maliyet farkları, yatırım programında yer alan projelerin programa alındığı yıl içerisinde hesaplanan proje tutarı ile tamamlanabilmesi mümkün olamamaktadır. Piyasaların sebep olduğu maliyet farklarının önüne geçilecek çalışmalar yapılmalıdır.
- 2) Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin daha tutarlı şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.
- 3) Yatırım projeleri söz konusu olduğunda toplam proje ödenekleri, fiziki alanların

tamamlanma zorunluluğu, yıl içerisinde nakdi gerçekleşmenin fiziki tamamlanma oranına uygun olmaması ve ödenek taleplerinin karşılanmaması en büyük sorun olarak görülmektedir. Bu sorunların önüne geçebilmek amacıyla kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek gerçek ihtiyaçlar uzmanlarca tespit edilip ödenek dağılımının bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

- 4) Ödeneklerin tamamının yılbaşında serbest bırakılmaması nedeniyle fiziki gerçekleşme nakdi gerçekleşmenin yüzde olarak üzerinde olabilmekte; bu durumda yükleniciye hak edişleri yapılamadığından imalatlar yavaşlayabilmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için ödeneklerin tamamının yılbaşında serbest bırakılması sağlanmalıdır.
- 5) Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.



## 5.KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU

**Kurum Adı:** Çankırı Karatekin Üniversitesi

**Bütçe Türü:** Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs.)

2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		237.900		33.500	33.500		38.300	38.300		60.750	60.750		43.884	43.884
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		5.497		4.397	4.397		1.100	1.100					1.100	1.100
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>243.397</b>		<b>37.897</b>	<b>37.897</b>		<b>39.400</b>	<b>39.400</b>		<b>60.750</b>	<b>60.750</b>		<b>44.984</b>	<b>44.984</b>

(\*Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.



# Çankırı Karatekin Üniversitesi

2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
