

Çankırı Karatekin Üniversitesi



2024 YILI
Yatırım Programı
İzleme ve
Değerlendirme
Raporu

1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	3
2. GENEL DEĞERLENDİRME	5
2.1. Üniversitemizin Misyonu	5
2.2. Üniversitemizin Vizyonu	5
2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri.....	5
2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları.....	6
2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu	7
2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi	8
2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı.....	9
2.8. 2024 Yılı Yatırım Uygulamaları.....	9
2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	9
2.8.2.Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları	10
3. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI	11
3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.....	11
3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	16
3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.....	17
3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	18
3.5. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.....	20
4. ÖNERİLER	21
5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU.....	23



1. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen **Çankırı Karatekin Üniversitesi**; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi, bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

Üniversitemiz, bu amacına ulaşmak için en son teknolojik makine ve teçhizatlar ile donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim vermek ve hedeflenen amaca ulaşan araştırmalar yapmak üzere fiziki altyapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamaktadır.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde; eğitim ve öğretim, sağlık, araştırma, sportif ve sosyal faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesi amacıyla 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında 5'i Eğitim-Yükseköğretim, 1'i Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor ile 1'i DKH-Sosyal ve Teknolojik Araştırma sektöründe olmak üzere 7 adet yatırım projesi yürütülmüştür. Bu yatırım projeleriyle Üniversitemizin fiziki, teknolojik ve araştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda derslik, laboratuvar, altyapı, gayrimenkul, makine-teçhizat gibi çeşitli alanlara yönelik satın alma, bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Kütüphane koleksiyonunun

2024 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

genişletilmesine yönelik basılı ve elektronik yayın alımı yapılmış ve telifine sahip olduğumuz ve aynı zamanda satın aldığımız yazılımların güncellenmesi yapılmıştır.

Bu bağlamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu' nun 25' inci ve 60' ıncı maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24' üncü maddesi uyarınca, Stratejik Plan ve Yatırım Programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz **2024 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu** ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Üniversitemizin Misyonu

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi ve bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

2.2. Üniversitemizin Vizyonu

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler ve araştırmacılar tarafından tercih edilen ve çalışanların benimsediği bir kurum olmaktadır.

2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı kapsamında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır.

AMAÇ 1: Öğrenci Merkezli ve Kalite Odaklı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti Sunmak

HEDEF 1: Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek.

HEDEF 2: Eğitim ve öğretimde nitelik ve çeşitliliğin artmasını sağlamak üzere dijital dönüşüm ve entegrasyon çalışmalarını desteklemek.

HEDEF 3: Öğrencilere yönelik uluslararasılaşma imkânlarını arttırmak.

HEDEF 4: Sosyal aktivite imkânlarının sayısını arttırmak.

HEDEF 5: Üniversite öğrencilerinin girişimcilik kabiliyetlerini arttırmak.

AMAÇ 2: Nitelikli Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Sunmak

HEDEF 1: Araştırmada fiziki ve teknik altyapıyı geliştirmek ve araştırmacı hareketliliğini arttırmak.

HEDEF 2: Dijital yerliler ve dijital göçmenler arasındaki farkı kapatacak altyapıları geliştirmek.

HEDEF 3: ÇAKÜ adresli yayın sayısını arttırmak.

HEDEF 4: Bilimsel araştırma projelerinin sayısını arttırmak.

HEDEF 5: Kütüphane imkânlarını iyileştirmek.

AMAÇ 3: Akademik Faaliyetlerin Toplumsal Katkıya Dönüştürülmesi

HEDEF 1: Üniversitemiz bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinin faaliyetlerini ve sayısını arttırmak.

HEDEF 2: Üniversitede üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak.

HEDEF 3: Kültür ve sanat yaşamının zenginleştirilmesine yönelik etkinlikler düzenlemek.

HEDEF 4: Sportif etkinliklerin tür ve sayısını arttırmak.

HEDEF 5: Toplum sağlığı yararına etkinlikler düzenlemek.

AMAÇ 4: Ekonomik ve Sosyal Etki Yaratan Girişimcilik Faaliyeti Sunmak

HEDEF 1: Kamu- Üniversite- Sanayi işbirliği güçlendirilerek bölgesel inovasyon ekosistemini düzenlemek.

HEDEF 2: Teknolojik ve sosyal inovasyon girişimlerini desteklemek.

HEDEF 3: Üniversite kaynaklı toplam FMH başvuru/ tescil sayısını arttırmak.

HEDEF 4: Ekolojik inovasyon farkındalığını artırıcı faaliyetler yapmak.

AMAÇ 5: Güvence Sistemi Sürekliliğini Destekleyecek Yönetimsel Faaliyetlerin Sunulması

HEDEF 1: Kurumsal kimlik anlayışını güçlendirmek.

HEDEF 2: Hizmet kalitesi ve kalite yönetim sistemi uygulamalarının niteliğini arttırmak.

HEDEF 3: Bilişim sistemlerinin (UBIS, EBYS vb.) kalitesini ve kapasitesini arttırmak.

HEDEF 4: Yerleşik altyapı olanaklarını ve fiziksel olanakları iyileştirmek.

HEDEF 5: Merkezi bütçe içi ve dışı gelirleri arttırmak.

2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2024 yılında Üniversitemiz başlangıç bütçe gelir tahminleri;

a) Hazine yardımları : 1.343.565.000,00TL

b) Öz gelirler : 38.317.000,00 TL olmak üzere

2024 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

toplamda **1.381.882,00 TL** dir.

Üniversitemizin 2024 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan ekleme ve düşmelerle bu ödenek 1.545.803.284,08 TL olmuş, söz konusu ödeneğin 229.795.885,00 TL'si yatırım giderlerinin finansmanı için tahsis edilmiştir. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır.

2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu

Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 1. Ekonomik ayrıma göre bütçe gelirleri durumu

2024 YILI GELİR CETVELİ		
GELİR EKONOMİK KOD	PLANLANAN GELİR	GERÇEKLEŞEN
03.1.1.99	0,00	55.242,60
03.1.2.03	0,00	9.956,02
03.1.2.10	0,00	207.727,07
03.1.2.29	10.000.000,00	20.193.768,82
03.1.2.31	3.633.000,00	1.893.338,00
03.1.2.32	0,00	67.419,34
03.1.2.33	354.000,00	188.200,00
03.1.2.34	10.059.000,00	4.130.132,50
03.1.2.36	349.000,00	549.500,00
03.1.2.45	536.000,00	826.703,75
03.1.2.69	3.233.000,00	13.596.092,40
03.1.2.99	359.000,00	288.200,00
03.6.1.01	216.000,00	288.166,83
03.6.1.99	355.000,00	319.824,17
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	29.094.000,00	42.614.271,50
04.2.1.01	1.155.203.000,00	1.246.315.030,00
04.2.2.01	187.500.000,00	112.443.970,00
04.5.1.13	0,00	306.000,00
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.342.703.000,00	1.359.065.000,00
05.2.6.16	297.000,00	1.778.747,75
05.3.2.99	0,00	-1.061.032,51
05.3.9.99	0,00	6.886,30
05.9.1.01	0,00	2.940,00
05.9.1.06	0,00	1.464.912,92
05.9.1.19	8.926.000,00	13.401.053,00
05.9.1.99	862.000,00	1.680.264,88
Diğer Gelirler	10.085.000,00	17.273.772,34

Ayrıca 55.395.887,00 TL tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları kullanarak yatırım bütçesinde ödenekleştirilmiş olup, 17.05.2024 tarihli ve 2024/7 sayılı tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Üniversitemiz yatırım ödeneklerinden 18.100.000,00 TL tutara Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yedeğe aktarılarak düşülmüştür. Aynı zamanda yıl içerisinde alt projeler arası aktarma 4.352.000,00 TL, projeler arası 3.400.000,00 TL, 5.000.000,00 TL de yedek ödenek aktarım işlemi gerçekleştirilmiştir.

2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi

Üniversitemizin mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Üniversitemizin mevcut hizmet üretim kapasitesi

Üniversitemiz Arsa Oturum Dağılımı (m ²)					
Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite	Maliye/Hazine	Diğer		
Uluyazı Yerleşke Alanı	-	2.080.899,42	-	2.080.899,42	Tahsisli
Rektörlük Ek Hizmet Binası	-	784,88	-	784,88	Tahsisli
Balıca Yerleşkesi	-	64.090,00	-	64.090,00	Tahsisli
Turizm Fakültesi (İlgaz)	-	-	4.015,00	4.015,00	Tahsisli
Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi (Taşmescit)	-	23.552,00	-	23.552,00	Tahsisli
ÇAKÜ Sosyal Tesis ve Konukevi	424,00	-	-	424,00	Kamu Kurumlarının Bedelsiz Devri
Kızılırmak Uygulama ve Araştırma Arazisi	-	331.654,12	-	331.654,12	Tahsisli
Kurşunlu MYO Yerleşkesi	-	-	8.314,00	8.314,00	Tahsisli
Çerkeş MYO Yerleşkesi	-	-	1.476,50	1.476,50	Tahsisli
Şabanözü MYO Yerleşkesi	-	-	2.492,56	2.492,56	Tahsisli

2.7.Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı

Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3. Üniversitemiz binalarının niteliksel dağılımı

Üniversitemiz Binalarının Dağılımı (m ²)	
Bina Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)
	Üniversite
Toplam Eğitim Alanları	28162,48
Toplam Laboratuvar Alanı	1501,00
Toplam Yemekhane-Kantin Alanı	8270,14
Toplam Lojman Alanı	4037,00
Toplam Spor Alanı	18816,00
Toplam Sosyal Tesis ve Yurt Alanı	1597,00
Toplam İdari Ofis Alanı	17047,22
Toplam Kütüphane Alanı	8723,00


2.8.2024 Yılı Yatırım Uygulamaları

2.8.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarınarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4. Genel yatırım uygulama durumu

Sektör	2024 Yılı KBÖ (TL)	2024 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi (TL)	Oran (%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	180.000.000,00	106.110.601,55	58,95
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor	1.000.000,00	1.715.213,22	171,52
DHK-Sosyal-Teknolojik Araştırma	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
Toplam	187.500.000,00	114.325.814,77	60,97

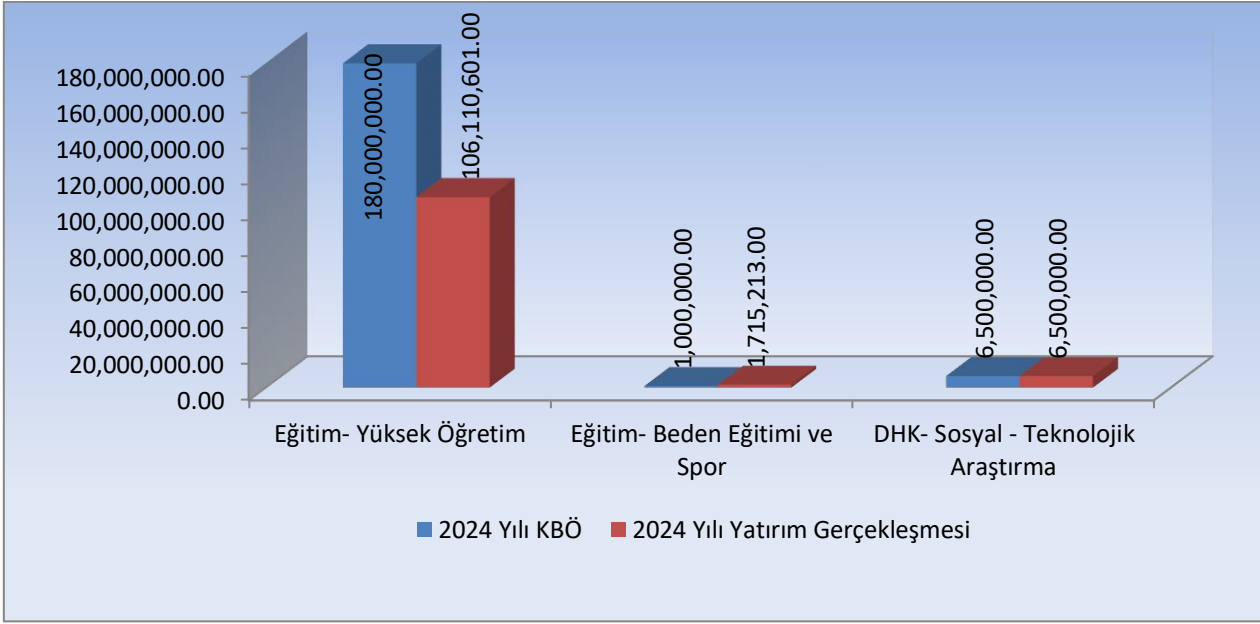

Şekil 1. 2024 Yılı genel yatırım uygulama grafiği

2.8.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları

Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Tablo 5. Sermaye giderlerinin ekonomik kod ve dağılımları

EKO. KOD	AÇIKLAMA	2024YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)	2024 YILI EKLENEN ÖDENEK (TL)	2024 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK (TL)	2024YILSONU TOPLAM ÖDENEK (TL)	HARCAMA (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	21.300.000,00	2.750.000,00	6.750.000,00	17.300.000,00	11.935.595,83
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	4.200.000,00	1.000.000,00	0,00	5.200.000,00	2.340.003,23
06.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	157.000.000,00	55.002.000,00	17.100.000,00	194.902.000,00	88.853.324,71
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	555.351,50
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.000.000,00	6.793.887,00	0,00	11.793.887,00	10.641.539,50
TOPLAM		187.500.000,00	66.145.887,00	23.850.000,00	229.795.887,00	114.325.814,77

3. 2024 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı


Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi						
Proje No: 2024H03-232853						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2024	500.000,00	0	50.000,00	450.000,00	0	0

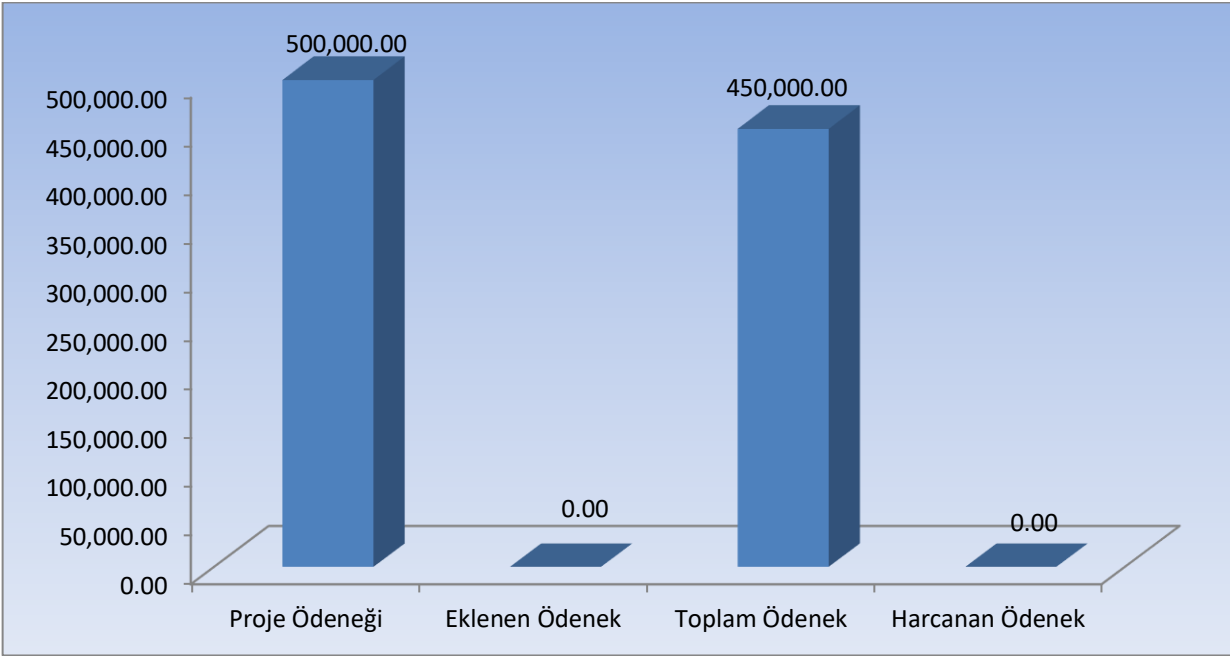

Şekil 2. Çeşitli ünitelerin etüt projesi (Proje No: 2024H03-232853) gerçekleşme grafiği

2024 yılı başlangıç ödeneği 500.000,00 TL olan proje tasarruf tedbirleri gerekçesiyle ödeneğin %10'u kısıtlanmıştır. 2024 yılı için toplam ödeneği 450.000,00 TL olmuştur. Harcama yapılmamıştır.

Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım)						
Proje No: 2024H03-232857						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2024	5.000.000,00	6.793.887,00	0	11.793.887,00	10.641.539,50	%90,22

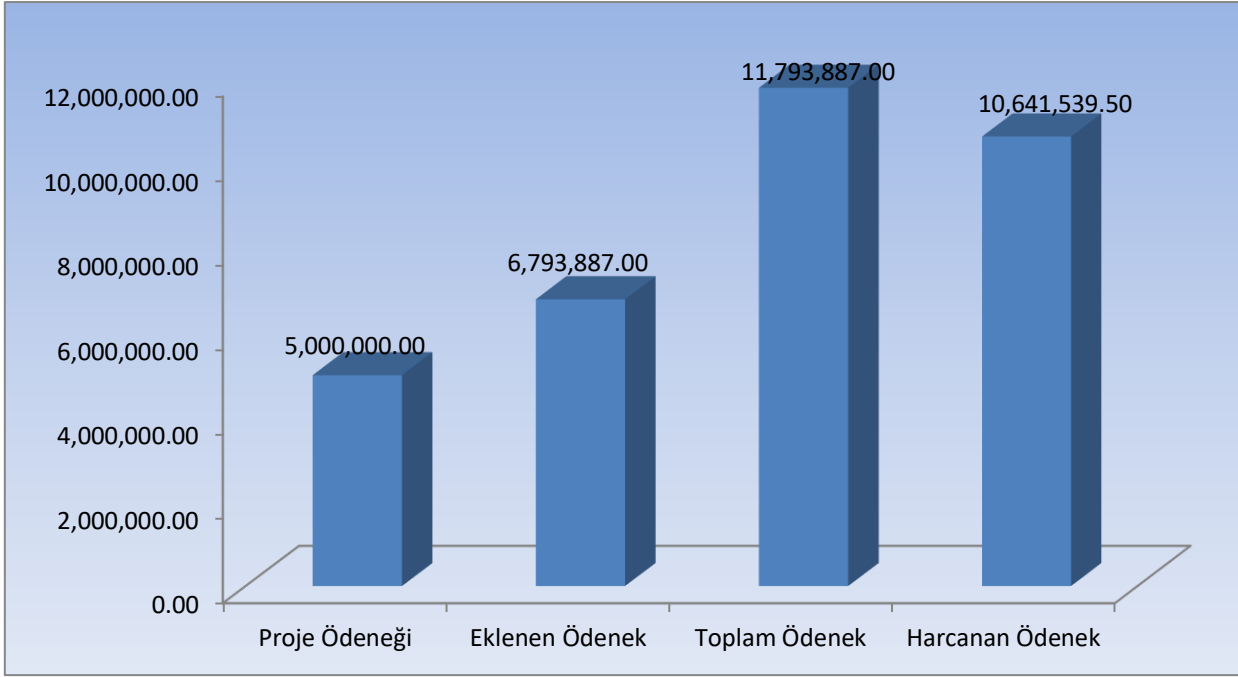

Şekil 3. Muhtelif işler büyük onarım projesi (Proje No: 2024H03-232857) gerçekleştirme grafiği)


2024 yılı içerisinde Başkanlığımızın ilgili bütçe kalemine 11.793.887,00 TL ödenek verilmiştir. Yılı sonu itibarıyla toplam harcama 10.641.539,50 TL olup gerçekleştirme oranı %90,24'tür.

Merkezi Derslik C Blok Terası Tadilat, Ofis ve Çatı Yapım İşi 30.05.2024 tarihinde ihale edilmiş olup firma ile 28.06.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yer teslim tarihi 03.07.2024'tür. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 15.09.2024'tür.

27.09.2024 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. İşin fiziki ve nakdi gerçekleştirme oranı %100'dür. Kesin hakedişi yapılmamıştır. Proje kapsamında C Blok terasında yaklaşık 300 m²'lik fiziki alanda 13 adet ofis oluşturularak kullanıma açılmıştır.

Gerekli olan çeşitli bakım onarım işleri tamamlanmıştır.

Proje Adı: Kampüs Altyapısı						
Proje No: 2020H03-150410						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklenen	Düşülen			
2024	10.000.000,00	0,00	2.400.000,00	7.600.000,00	2.431.763,61	%32

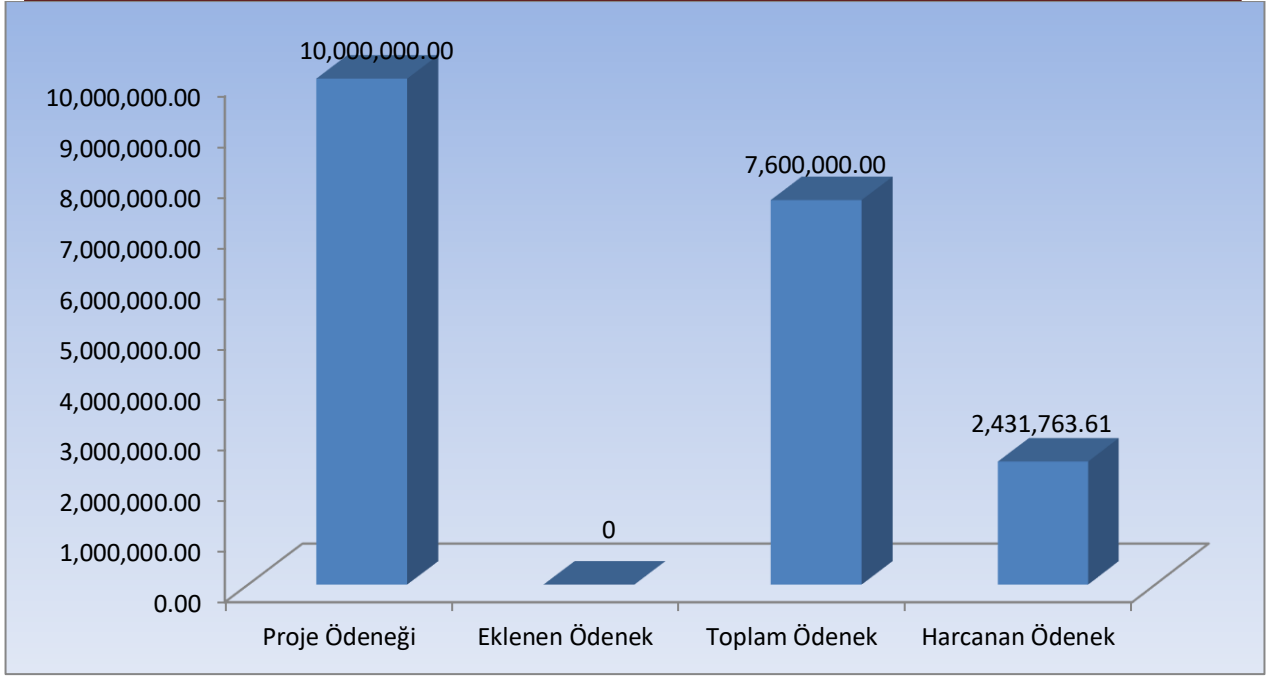

Şekil 4. Kampüs altyapısı projesi (Proje no:2020h03-150410) gerçekleştirme grafiği

2024 yılı ödeneği 7.600.000,00 TL olup yılsonuna kadar yapılan harcama 2.431.764,00 TL olmuştur. Yılsonu gerçekleştirme oranı %32'dir.

Sıfır Atık Deposu Yapım İşi 29.02.2024 tarihinde ihale edilmiş, 19.03.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 05.05.2024'tür. 27.05.2024 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. İşin fiziki ve nakdi gerçekleştirme oranı %100'dür. Kesin hakediş yapılmıştır.

Gerçekleştirilen diğer işler;


- Muhtelif Alanlarda Andezit Tadilatı Yapılması işi ödemesi
- Üniversitemiz 2. Etap Hurdalık Sahası Hafriyat Alınması, Tesviye Edilmesi ve Beton Atılması İş
- Üniversitemiz Uluyazı Kampüs Girişinde Fırtına Nedenli Hasar Gören Aydınlatma Direğinin Onarım İş
- Rektörlük Binası Yanında Bulunan ve Fırtına Nedeni ile Yıkılan Kamelya Onarım İş Ödemesi
- Şev Taşı Alım İş Ödemesi
- Çeşitli Binalara İtfaiye Su Verme Bağlantısı Yapılması İş Ödemesi
- Depo Girişinin Çimli Tel Çitle Kapatılması İş Ödemesi

2024 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No: 2009H03-1043

Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2024	145.500.000,00	55.004.000,00	16.352.000,00	184.152.000,00	84.706.347,88	%45,99

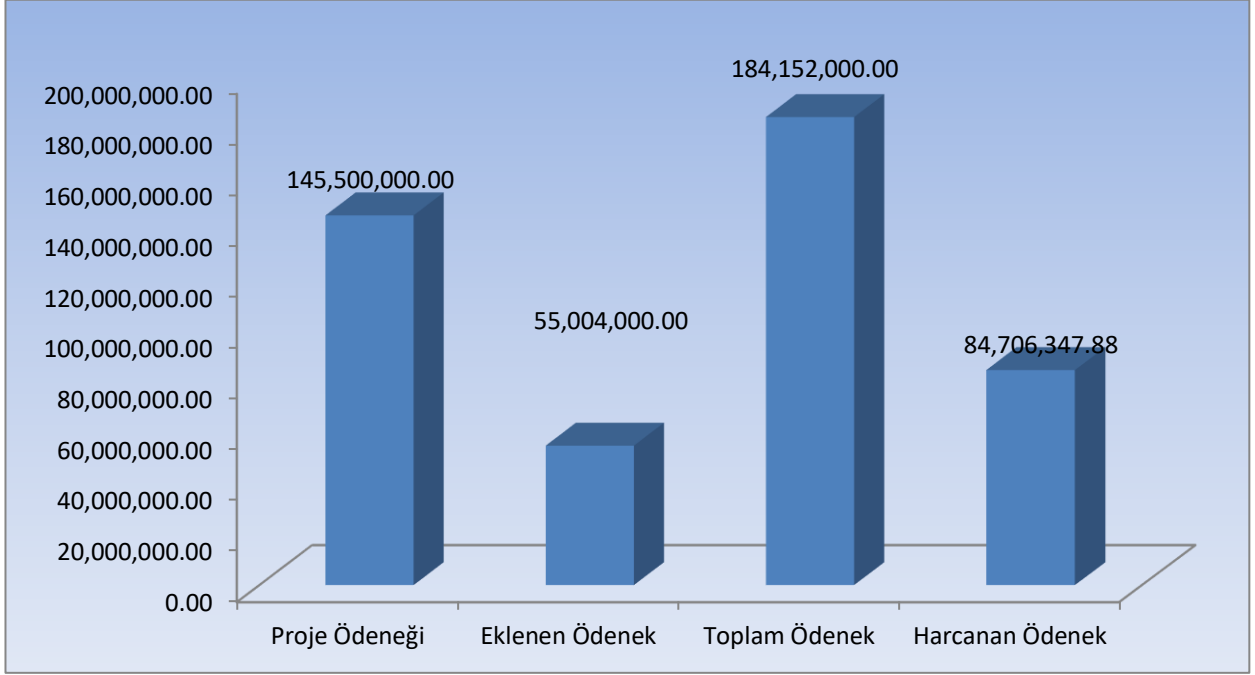

Şekil 5. Derslik ve merkezi birimler projesi (Proje no:2009h03-1043) gerçekleşme grafiği

Proje kapsamında;

Mühendislik Fakültesi Binası ve Çevre Düzenleme Yapım İşi 03.08.2021 tarihinde ihale edilmiştir. 02.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı %89'dur. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 31.03.2026'dır. İş devam etmektedir.


Çankırı Karatekin Üniversitesi 2500 m² Merkezi Derslik Projesi kapsamında Merkezi Derslik C Blok Yapım İşine ait sözleşme 08.06.2022 tarihinde imzalanmış olup 16.06.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 09.08.2023'tür. 07.10.2024 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. İşin fiziki ve nakdi gerçekleşme oranı %100'dür. Kesin hakedişi yapılmamıştır.

2024 yılında ilgili iş için 2 defa ihaleye çıkılmış olup yeterli teklifin sağlanamaması ve tekliflerin yaklaşık maliyetinde çok üzerinde verilmesi gibi gerekçelerle ihaleler iptal edilmek zorunda kalmıştır. Proje karakteristiği güncellenmiş olup Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Binası

2024 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Yapılması İşi ihale adıyla 09.01.2025 tarihinde ihalesi yapılacaktır.

Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri						
Proje No: 2024H05-232863						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2024	1.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	1.715.213,22	63,52

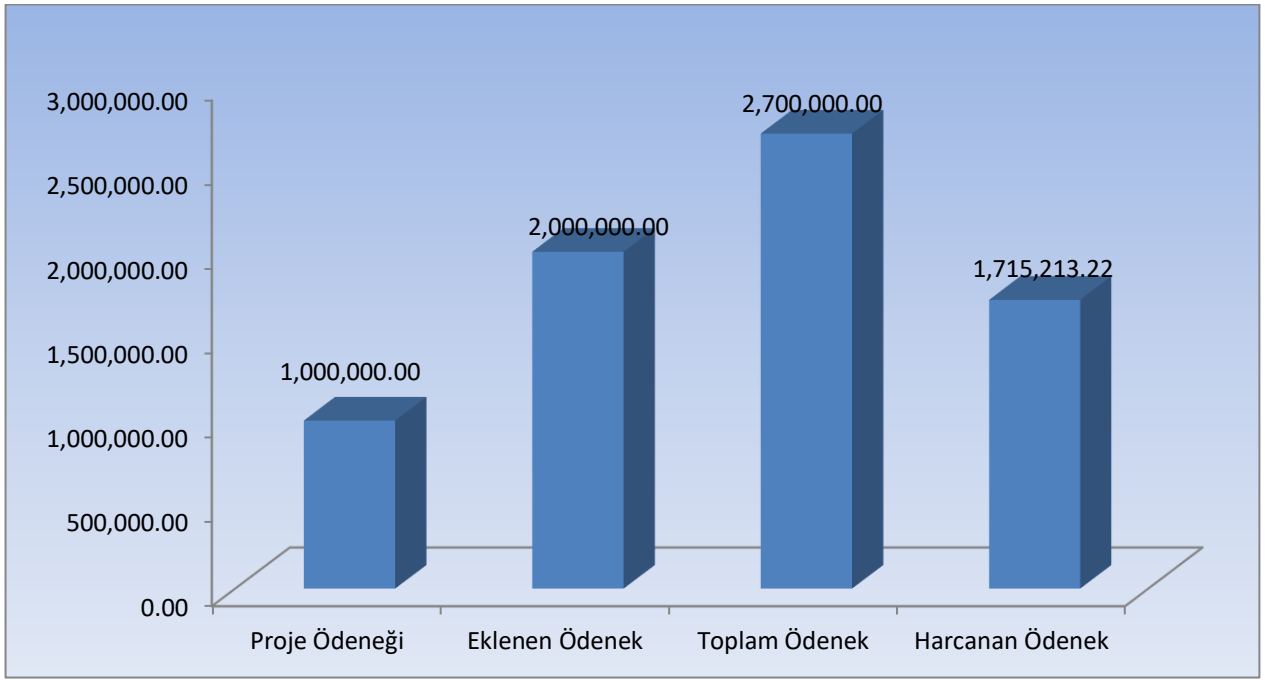

Şekil 6. Açık ve kapalı spor tesisleri projesi (Proje no: 2024H05-232863)gerçekleşme


2024 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000,00 TL'dir. Önceki işlerden olan Kapalı Spor Salonu Yapım İşinden kaynaklı icra borcu ödemesinin yapılma zorunluluğu mahkeme ilamıyla ortaya çıkmıştır. Bu ödemenin yapılabilmesi için ilgili projeye Sağlık Kampüsü Ortak Derslik Projesinden 2.000.000,00 TL ek ödenek sağlanmıştır. Yılısonu itibariyle toplam harcama 1.715.213,22 TL'dir.

2024 yılı yapılan işler;

- Kapalı Spor Salonu Yapım İşinden Kaynaklı İcra Borcu Ödemesi
- 2 Adet Taşınabilir Çelik Tribün Yapım İş

3.2.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı)						
Proje No: 2024H03-232857						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2024	2.000.000,00	3.350.000,00	600.000,00	4.750.000,00	2.500.921,69	% 52,65

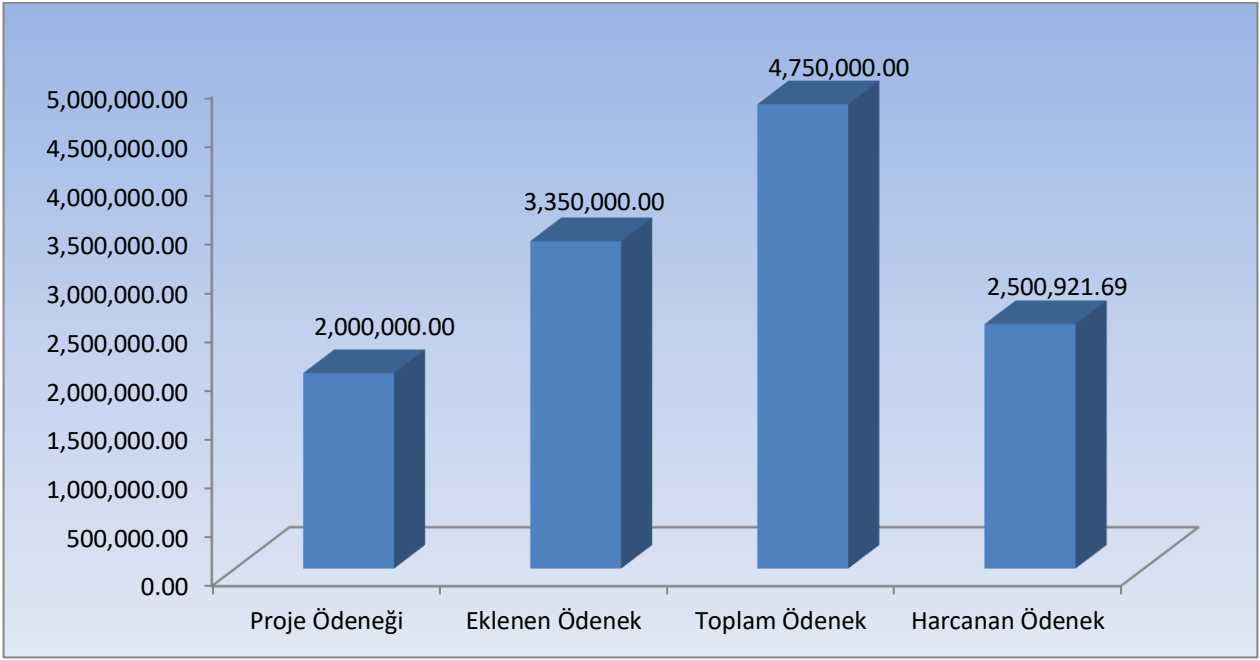

Şekil 7. Muhtelif işler projesi (Proje no:2024H03-232857) gerçekleştirme grafiği

2024 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Muhtelif İşler Projesi ile Üniversitemize ayrılan 2.000.000,00 TL ödenekten yıl içerisinde 3.350.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, toplam 4.750.000,00 TL ödenegın 2.500.921,69 TL' si kullanılarak % 52,65 gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje kapsamında aşağıdaki harcamalar gerçekleştirilmiştir:

1-DMO Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı

- Hukuk Fakültesi- Fotokopi Makinesi Alımı, Güvenlik Kamerası İç Ortam- Dış Ortam
- Dış Hekimliği Fakültesi- Dış Üniteli ve Tıbbi Çöp Poşeti Alımı
- Sağlık Bilimleri Fakültesi- Muayene Masası Alımı

2-Doğrudan Temin Yoluyla Alınan Alımların Birimlere Göre Dağılımı


- Genel Sekreterlik- Bariyer Sistemi, Fotoselli El Kurutma Makinası

Alımı

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Bariyer Sistemi
- Fen Fakültesi- Mekanik ve Elektrik Laboratuvarları İçin Deney Setleri Alımı, Optik ve Dalgalar Laboratuvarı için Deney Setleri Alımı, Eğitim Seti ve Uygulama Modülünün Alımı
- Meslek Yüksekokulu - Üfleme Makinası Alımı

3.3.Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Proje Adı: Yayın Alımı						
Proje No: 2024H03-232855						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2024	4.000.000,00	0,00	400.000,00	3.600.000,00	1.842.349,35	%51,17

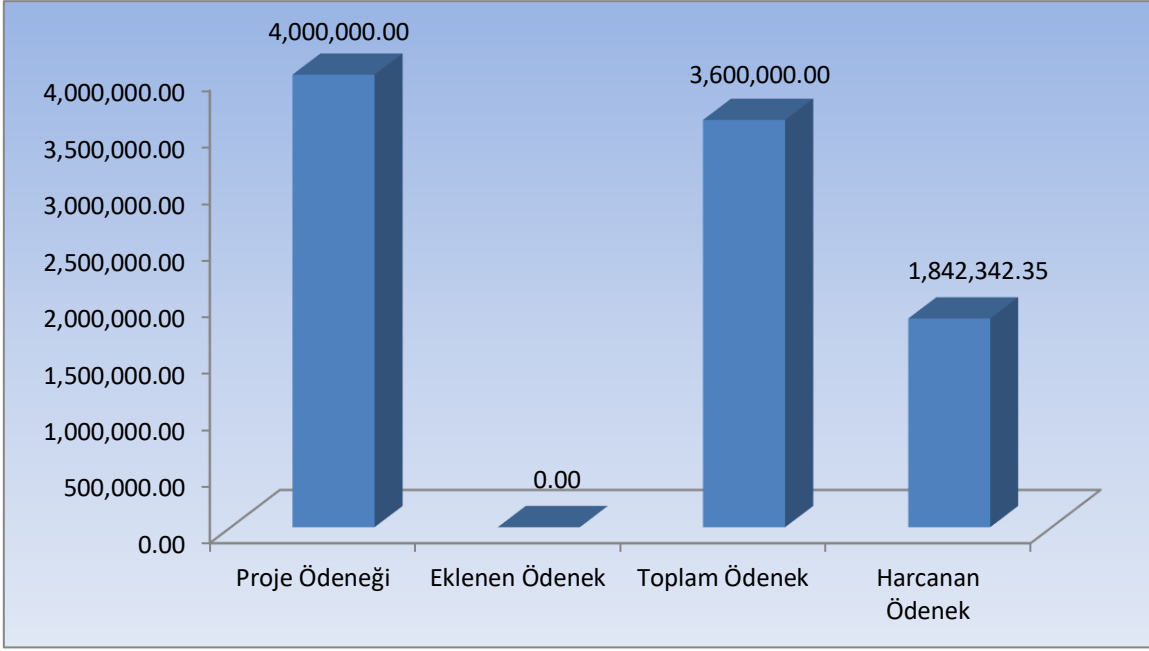

Şekil 8. Yayın alımı projesi (Proje no: 2024H03-232855) gerçekleşme grafiği

2024 yılı için tahsis edilen 4.000.000,00 TL bütçenin 400.000,00 TL %10 kısmı tasarruf tedbirleri nedeniyle kesilmiş; mevcut elektronik yayın abonelikleri, yeni e-kaynak aboneliği gerçekleştirilmiştir. Bir kalemde Üniversitemiz akademik birimlerinin talebi olan basılı kitap satın alınmış olup 1.757.650,65TL tutarındaki ödenek kullanılamamıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki listede belirtilen elektronik veri tabanlarına abonelikleri gerçekleştirilerek bedeli ödenmiştir.

Abone olunan tam metin veri tabanları ve elektronik ortamda sağlanan ürünler,


- *Turcademy Kitap Koleksiyonu*
- *HiperKitap Türkçe Tam Metin Kitap platformu*
- *İdealonline Tam Metin Türkçe Dergi Platformu*
- *Legal Online Hukuk Dergi ve Kitapları platformu*
- *Wikilala*
- *E-Osmanlıca*
- *Kelime.com*
- *AYEUM*
- *Bookcites Kitap atıfları veri tabanı*
- *LC ClassWeb Aracı*
- *Sinerji Mevzuat ve İçtihat Elektronik Veri Tabanı*
- *Lehçediz*
- *Springer robotic collection 2022,2024*

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

Yıl içerisindeki kur değişimleri ve enflasyona bağlı fiyat artışlarından kaynaklı döviz artışı Türk Lirası bazında Yurtdışı kaynaklı basılı ve elektronik yayınların fiyatlarını etkilediğinden koleksiyon gelişimi hedeflenen seviyede gerçekleşmemiştir.

3.4.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri-Yazılım-Donanım Alımı)						
Proje No: 024H03-232857						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2024	13.000.000,00	1.000.000,00	5.750.000,00	8.250.000,00	3.987.679,52	%48,33

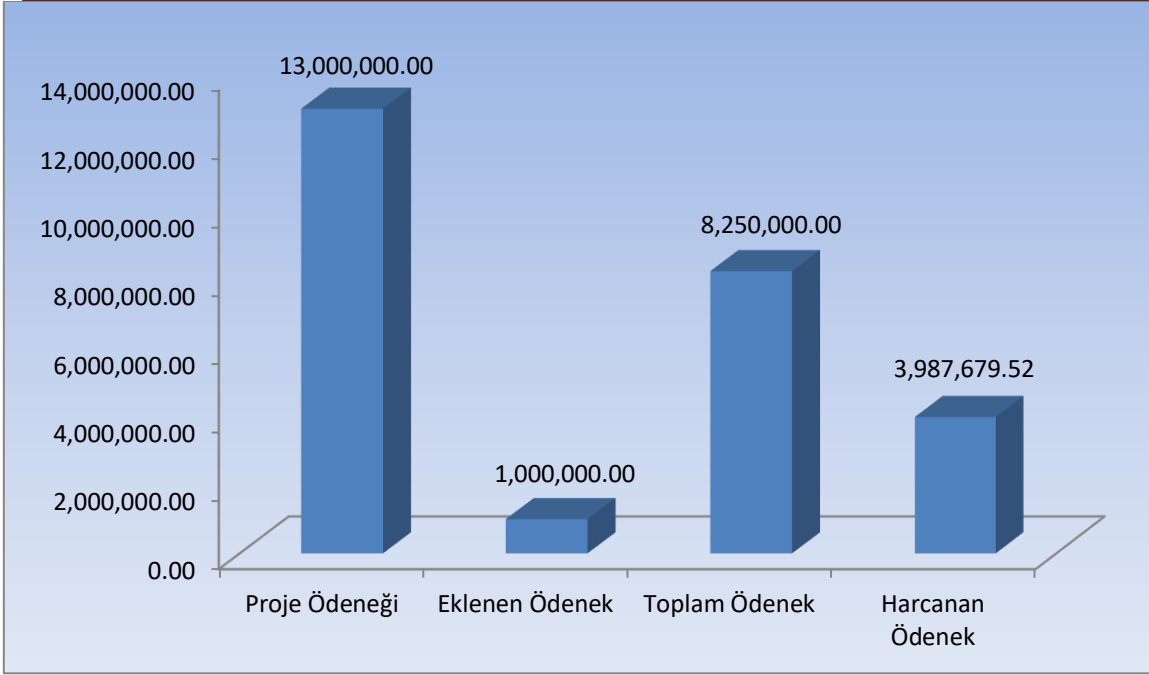

Şekil 9. Muhtelif işler (bilgi teknolojileri-yazılım- donanım) projesi (Proje no: 024H03-232857) gerçekleştirme grafiği

2024 yılında 024H03-232857 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile Üniversitemize ayrılan 13.000.000,00 TL ödeneye yıl içerisinde 1.000.000,00 TL eklenmiş olup, toplam 8.250.000,00 TL ödeneğin 3.987.679,52 TL'si kullanılmış olup % 48,33 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Proje kapsamında;


- Üniversitemizin Bünyesinde kullanılmak üzere ekran kartı, güç kaynağı ve monitör ayağı 6 adet ekran kartı, 1 adet güç kaynağı, 1 adet monitör ayağı alımı yapılmıştır.
- Üniversitemiz tüm birimlerinde aktif olarak kullanılmak üzere 100 adet IP Telefon temini yapılmıştır.
- Üniversitemiz Uluyazı Kampüsü yerleşkesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tutarındaki muhtelif bilgisayar donanım malzemeleri 2024 bütçe kaynakları doğrultusunda, doğrudan temin usulü ile satın alınmıştır.
- Üniversitemiz akademik, idari birimler ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere Devlet Malzeme Ofisi üzerinden 25 adet masaüstü bilgisayar temini yapılmıştır.
- Birimlerimiz tarafından ihtiyaç duyulan bilişim malzeme talepleri üzerine, ödeneğimiz ölçüsünde gerekli çalışmalar yapılarak, muhtelif bilgisayar donanım malzemeleri doğrudan temin yolu ile satın alınmıştır.
- Üniversitemizin tüm Akademik ve İdari birimlerinin eksik malzemelerini tamamlamak amacıyla 2024 bütçemiz kaynakları doğrultusunda doğrudan temin ile satın alım gerçekleştirilmiştir.

2024 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

- Üniversitemizin İdari ve Akademik birimlerinin ihtiyaçlarına binaen harcama yaparak Doğrudan Temin ile 1 adet NVR Kayıt Cihazı ve 5 adet IP Kamera temin edilmiştir.
- Üniversitemizde kullanılan öğrenci bilgi sistemi, yaşam hizmetleri ve Bologna WEB sitesi modüllerinin yıllık bakım ve destek yazılımı temini yapılmıştır.
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi V5 versiyonu için güncelleme ve bakım sözleşmesi yapılmıştır.
- Üniversitemizde kullanılan bilişim sistemlerini kontrol etmek ve varsa güvnelik açıklarını kapatmak için Sızma (Penetrasyon) testi yapılmıştır.
- Üniversitemizde kullanılan bilgisayarların korunabilmesi için Eset Antivirüs yazılımı için harcama yapılmıştır.
- Üniversitemizde kullanılan IOS cihazları için (1 yıllık) mobil uygulama geliştirici programı ve başkanlığımızın yazılım biriminin ihtiyacına binaen yapay zeka dil modeli (ChatGPT) temini yapılmıştır.
- Yapı İşleri ve Teknik Diare Başkanlığının kullanmakta olduğu Hakediş Bilgisayar paket programının Lisans ve işçi maaşı yazılım programı süresi dolduğundan Hakediş programı satın alınmıştır.
- Üniversitemiz Öğrencilerinin Lisanslarının güncellenmesi ve takip edilebilmesi için DMO e- satış portalı yoluyla Microsoft Kampüs lisansı temin edilmiştir.
- Üniversitemizde göreve başlayan idari ve akademik personeller için Nitelikli Elektronik Sertifika, Kart Okuyucu ve Zaman Damgası temin edilmiştir.
- Çankırı Karatekin Üniversitesinin ihtiyacına binaen CAKUAVIS akademik veri yönetim sistemi, enstitü tez yönetim sistemi ve akademik ilan başvuru sistemi yazılımı ve akademik personelin bilimsel çalışmaları karşılığında ödenecek ücretlerin sistem üzerinden yapılabilmesi için akademik teşvik sistemi yazılımı yapılmıştır.
- Hukuk Müşavirliğinin ihtiyacına binaen Mevzuat ve İctihat programı ve MAXQDA nitel veri analiz programı satın alınmıştır.

3.5.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi						
Proje No: 2017K120072						
Yılı	Proje Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)		Toplam (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)
		Eklene	Düşülen			
2024	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	% 100,00

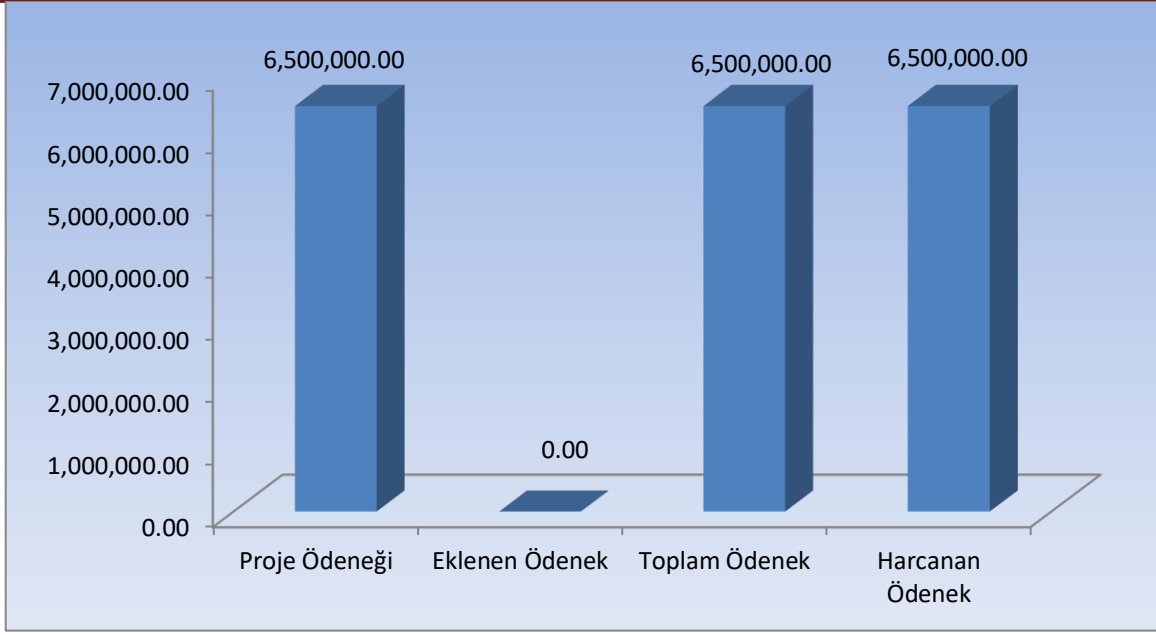

Şekil 11. İleri Malzeme ve Teknolojiler Laboratuvarı (Proje no: 2017k120072) gerçekleştirme grafiği

2024 yılında 2017K120072 nolu İleri Malzeme ve Teknolojiler Laboratuvarı Projesi ile Üniversitemize ayrılan 6.500.000 TL ödeneğin tamamı kullanılmış olup %100,00 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

4.ÖNERİLER

- 1) Her yıl piyasalardaki değişim sebebi ile ortaya çıkan maliyet farkları, yatırım programında yer alan projelerin programa alındığı yıl hesaplanan proje tutarı ile işlerin tamamlanmasını mümkün kılmamaktadır. Piyasaların sebep olduğu maliyet farklarının önüne geçilecek çalışmalar yapılmalıdır.
- 2) Yatırım teklifleri yapılırken teklif edilen projeye ilişkin uygulama projesi veya kesin projenin görüşülmesi ve bunlar üzerinden değerlendirme yapılması bütçe açısından gerekli mali değerlendirmelerin en tutarlı şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.
- 3) Yatırım projeleri söz konusu olduğunda toplam proje ödenekleri, fiziki alanların tamamlanma zorunluluğu, yıl içerisinde nakdi gerçekleşmenin fiziki tamamlanma oranına uygun olmaması ve ödenek taleplerinin karşılanmaması en büyük sorun olarak görülmektedir. Bu sorunların önüne geçilemek amacıyla kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek gerçek ihtiyaçlar uzmanlarca tespit edilerek ödenek dağılımının bu doğrultuda yapılması önemlidir.

4) Ödeneklerin tamamı yılbaşında serbest bırakılmadığı için fiziki gerçekleşme nakdi gerçekleşmenin yüzde olarak üzerinde olabilmekte bu durumda yükleniciye hak ediş yapılamadığından imalatlar yavaşlayabilmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için ödeneklerin tamamı yılbaşında serbest bırakılmalıdır.

5) Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.

5.KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU

Kurum Adı: Çankırı Karatekin Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs.)

2024 Yılı Fiyatlarıyla, TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2023 Sonu Kümülatif Harcama			2024 Yılı Program Ödenek			2024 Yılı Revize Ödenek			2024 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		890.416.000		143.314.000	143.314.000		181.000.000	181.000.000		42.295.887	42.295.887		107.825.815	107.825.815
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		26.760.800		20.260.800	20.260.800		6.500.000	6.500.000					6.500.000	6.500.000
TOPLAM	7		917.176.800		163.574.800	163.574.800		187.500.000	187.500.000		42.295.887	42.295.887		114.325.815	114.325.815

(*)Genel Bütçe, Özel Bütçe, Düzenleyici ve Denet.Kur., KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye ve SGK, Mahalli İd., Hibe vs gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.



Çankırı Karatekin Üniversitesi

2024 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
